



더 낮은 자세로 실천하는 겸손의 규정

민선7기 구청장 공약사업[2019.12.31. 기준]

자 체 평 가 보 고 서



수 영 구
[기획감사실]



민선7기 구청장 공약사업

자체평가 보고서

(2019.12.31. 기준)

목 차

I. 공약사업 현황	1
II. 평가개요	2
III. 종합평가결과	2
IV. 분야별 평가개요	8
V. 분야별 평가내용	17
1. 문화·관광	19
2. 복지·보건	35
3. 교육·보육	55
4. 교통·안전	69
5. 생활·경제	91

공약추진상황 자체평가 결과 보고서

【2019.12.31.기준 자체평가 총평】

○ 2019년 하반기까지 전체 공약이행률은 60%

(2019년 상반기45% → 하반기 60%, 15% 상향)로,

- ▷ 구청장 공약사업 실천계획 수립시 작성한 연도적 세부추진 계획에 따라 적극적으로 각종 사업을 추진하여 41개 사업 중 15개 사업이 완료되는 등 41개 공약사업이 연차별 목표 대비 잘 추진되고 있음,
- ▷ 50% 미만 추진 중인 사업에 대해서는 2020년 세부 실행 계획을 체계적으로 추진하고 부서별 자체 추진사항을 점검 하여 사업진척이 원활하게 이루어지도록 하고,
- ▷ 미착수 6개사업에 대해서는 해당부서별 추진방안 강구 등을 통해 민선7기 2년차 내에 사업이 착수될 수 있도록 노력해야 할 것임.

○ 평가총괄부서 주관 지속적인 평가분석을 실시하고 평가결과를 사업부서에 통보하여, 사업평가의 환류가 지속적으로 이루어질 수 있도록 관리시스템을 마련하는 등 민선7기 구청장 임기 내 구민과의 약속인 공약사업이 추진목표 대비 100% 완료될 수 있도록 추진.

I. 공약사업 현황


○ 추진기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. (4개년)

○ 대상사업 : 5개 분야 41개 단위사업

분 야	계	문화·관광	복지·보건	교육·보육	교통·안전	생활·경제
건 수	41	8	10	6	10	7
소요예산 (백만원)	212,229.3 (100%)	39,020 (18.4%)	41,144.3 (19.4%)	15,150 (7.1%)	78,225 (36.9%)	38,690 (18.2%)

○ 총사업비(예상) : 212,229.3백만원 ※ 2019.12.31. 기준

▷ 국비 63,224.2, 시비 67,252.9, 구비 65,431.3, 기타 15,010

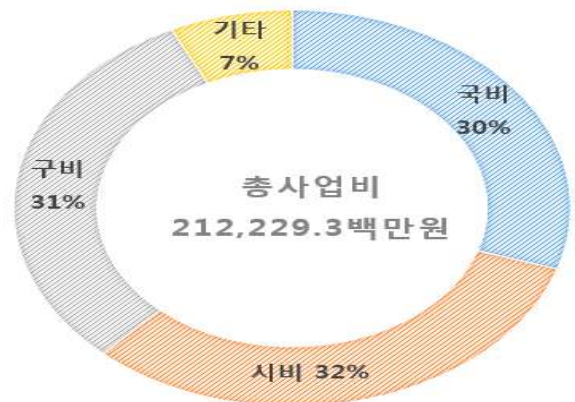

○ 추진부서 : 12개 부서

창조도시 교육추진단	총 무 과	문 화 관 광 과	주민생활 지 원 과	복 지 서 서비스과	환 경 위 생 과
4	2	5	1	11	1
일 자 리 경 제 과	안 전 관 리 과	교 통 행 정 과	건 축 과	건 설 과	보 건 소
3	1	6	1	5	1

II. 평가개요


- 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2019.12.31. (기준일 : 2019.12.31.)
- 평가방법 : 해당부서 자체평가 및 총괄부서(기획감사실) 종합평가
- 평가내용
 - ▷ 사업별 추진현황 및 진행률 파악
 - ▷ 추진상 장애요인과 문제점, 향후대책 등 분석
 - ▷ 평가를 완료, 추진중, 미착수(노력요함) 등으로 분류

III. 평가결과


○ 분야별 추진 현황 및 이행율

- ▷ 완료 15건, 추진중 20건, 미착수 6건

구 분	계	문화관광	복지보건	교육보육	교통안전	생활경제
건 수	41	8	10	6	10	7
완 료	15	3	5	4	1	2
추진중	20	4	5	1	7	3
미착수	6	1	0	1	2	2
이행률	60%	55%	71%	82%	44%	55%

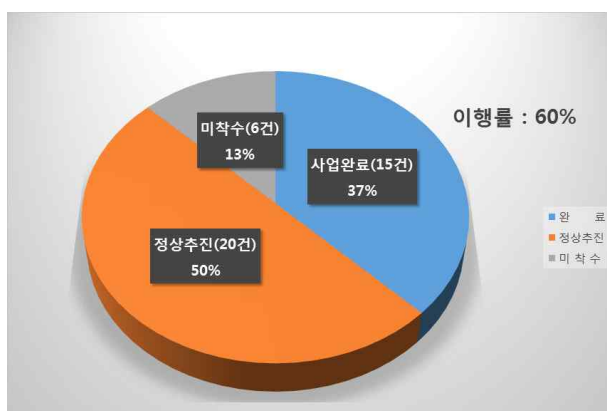

이행사항 결과

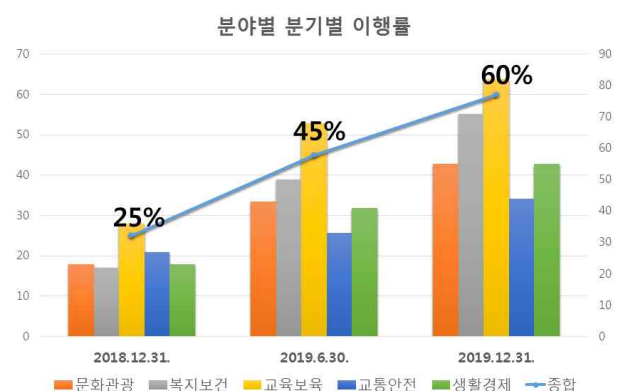

분야별 및 분기별 이행률

○ 공약명 변경

공약명 변경 내역		변경사유
번호	공약 3-1	당초 우선 중학생 대상으로 교복지원 사업 시행 예정이었으나, 부산시교육청의 중학생 교복비 지원사업 실시계획에 따라 중복 지원 방지를 위해 공약명과 지원대상 변경
기존	중·고등학생 무상교복 지원	
변경	고등학생 무상교복 지원	
번호	공약 5-5	2019년 3월 수영구청 1층에 새롭게 독립된 공간에 취·창업지원센터를 이전, 수영구 일자리종합센터를 개소하여 전문 인력 운용 및 프로그램 다양화로 최상의 고용서비스를 제공함에 따라 공약명을 변경
기존	수영구 취·창업지원센터 활성화	
변경	수영구 일자리종합센터 활성화	

○ 공약이행 완료사업현황(주요성과)

완료 사업		주요성과
번호	공약 1-7	망미2동 복합주민센터 건립사업은 지역주민이 행정·복지·문화 등 다양한 서비스를 한 장소에서 편리하게 누릴 수 있는 행정인프라 구축사업으로 2018년부터 공사를 시작하여 2019년 10월에 준공, 11월부터 업무를 개시
공약명	망미2동 복합주민센터 건립	
번호	공약 1-7	2017년부터 공사를 시작한 수영구 스포츠문화 타운 조성사업이 2019년 6월 완공, 청소년 문화의 집·평생학습관·국민체육센터 3개동이 건립되어 7월부터 운영에 들어가 구민 누구나 가까운 곳에서 편리하게 문화·체육 생활을 할 수 있도록 스포츠문화 인프라를 조성
공약명	청소년 문화의 집 건립	
번호	공약 3-2	
공약명	수영구 평생학습관 건립	
번호	공약 5-4	
공약명	수영구 국민체육센터 건립	

완료 사업		주요성과				
<table><tr><td>번호</td><td>공약 1-8</td></tr><tr><td>공약명</td><td>수영강변 한전주 지중화 사업</td></tr></table>		번호	공약 1-8	공약명	수영강변 한전주 지중화 사업	2018년 6월 한전과 및 통신사업자와 지중화 사업 이행협약 체결 이후 본격적으로 추진 되어 2019년 12월 완공한 수영강변 한전주 지중화사업은 수영강변 일원 미관을 개선하고 지역주민과 관광객에게 오래 기억될 명품 뷰 (VIEW)를 제공
번호	공약 1-8					
공약명	수영강변 한전주 지중화 사업					
<table><tr><td>번호</td><td>공약 2-3</td></tr><tr><td>공약명</td><td>장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원</td></tr></table>		번호	공약 2-3	공약명	장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원	장애인복지시설 16개소, 노인복지시설(경로당) 88개소에 공기청정기를 구매·배부 완료하는 등 건강취약계층인 장애인과 노인에 대한 미세먼지 보호설비를 지원하여 (초)미세먼지 피해를 사전에 예방하고 건강한 생활을 보장
번호	공약 2-3					
공약명	장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원					
<table><tr><td>번호</td><td>공약 2-5</td></tr><tr><td>공약명</td><td>수영구 노인복지관 분관 건립</td></tr></table>		번호	공약 2-5	공약명	수영구 노인복지관 분관 건립	2019년 9월 준공한 수영구 노인복지관 분관 건립을 통해 연차적 노령사회 진입에 따른 노인의 문화적 욕구를 해소하고 활기차고 행복한 노후생활 보장
번호	공약 2-5					
공약명	수영구 노인복지관 분관 건립					
<table><tr><td>번호</td><td>공약 2-6</td></tr><tr><td>공약명</td><td>수영구 장애인복지관 건립</td></tr></table>		번호	공약 2-6	공약명	수영구 장애인복지관 건립	2019년 9월부터 운영중인 수영구 장애인복지관은 지역 장애인과 지역주민들을 위한 다양한 프로그램을 개설하여 장애인식개선 등 양질의 장애인 재활서비스를 제공
번호	공약 2-6					
공약명	수영구 장애인복지관 건립					

완료 사업		주요성과
<div> <div>번호</div> <div>공약 2-8</div> </div> <div> <div>공약명</div> <div>발달장애인 지원 확대</div> </div>		<p>성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 향상과 행동발달을 위하여 소득별 차등 지원을 통해 장애아동 양육가족의 발달재활서비스 비용으로 인한 경제적 부담을 경감</p>
<div> <div>번호</div> <div>공약 2-10</div> </div> <div> <div>공약명</div> <div>보건소 치매안심센터 운영</div> </div>		<p>지상 3층(565.18㎡), 사업비 573백만원 규모의 보건소 치매안심센터 설치공사를 완료, 2018. 12월 정식 개소를 통해 치매예방, 상담, 조기진단, 교육 및 치매가족 지원 등 유기적 치매통합관리 서비스를 제공하여 국민의 행복한 삶에 기여</p>
<div> <div>번호</div> <div>공약 3-1</div> </div> <div> <div>공약명</div> <div>고등학생 무상교복 지원</div> </div>		<p>교복지원 관련조례 제정 및 2019년도 교복비 지원사업 예산편성 등 적극적인 행정을 통해 수영구 거주 고등학생 입학생 1,116명에게 교복구입비 30만원씩 335백만원을 지원하여 입학철 학부모님들의 교육비 부담 경감 및 교육의 공공성 강화에 기여</p>
<div> <div>번호</div> <div>공약 3-4</div> </div> <div> <div>공약명</div> <div>수영구 육아종합지원센터 건립</div> </div>		<p>가정양육 아동 지원 및 보육교직원 교육 등 종합적인 육아서비스 제공을 위한 수영구 육아종합지원센터를 건립하여 2019. 6월 개소하였고, 질 높은 보육서비스 제공을 위한 국·공립어린이집 2개소를 개원하여 부모가 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하고 출산장려 분위기를 제고</p>
<div> <div>번호</div> <div>공약 3-6</div> </div> <div> <div>공약명</div> <div>국·공립 보육시설 증설</div> </div>		

완료 사업		주요성과
번호	공약 4-4	총 39억원을 투입해 민락동 110-15번지에 162면 규모의 수변어린이공원 공영주차장을 준공하여 만성적 주차난으로 인한 이용객들의 불편을 해소
공약명	수변어린이공원 공영주차장 조성	
번호	공약 5-5	남천1동에 소재하고 있던 취·창업지원센터와 구청 내 취업 전용 상담창구를 통합하여 2019년 3월 구청 1층에 독립된 공간으로 수영구 일자리종합센터를 만들어 구민들의 접근성을 높이고 취·창업 전문상담 공무원을 채용하여 전문성을 확보하여 보다 나은 고용 서비스를 제공
공약명	수영구 일자리종합센터 활성화	

○ 미착수 사업 유형별 현황 및 검토사항






유 형	공약명 및 검토사항
민간협약이 필요한 경우(2)	공약 4-3. 민락매립지 공영주차장 증설 (수상관광호텔) ▶ 사업대상부지 및 대안부지 조속히 확보
	공약 4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축 [남천2구역] ▶ 남천2구역 재개발 사업과 병행하여 원활한 사업 추진 검토
재정이 수반되는 경우(3)	공약 1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충 (부지매입비) ▶ 국·시비 확보 노력과 재정투입 가능 시점에서 즉시 사업 진행 추진
	공약 3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원 (市 교육협력과 건립지원비) ▶ 국·시비 확보 노력과 재정투입 가능 시점에서 즉시 사업 진행 추진
	공약 5-2. 반려견 놀이공원 조성 (부지매입비) ▶ 사업대상부지 및 대안부지 조속히 확보
다른 기관에서 주관 또는 협의해야 하는 경우(1)	공약 5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거(부산지방경찰청) ▶ 관련 기관과의 협의를 통해 제반 절차 조속히 추진




IV. 분야별 평가개요

※ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2019.12.31.




※ 기준일 : 2019.12.31.






○ 문화·관광분야 : 8개 사업(완료3, 추진중4, 미착수1), 55%





사업명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비고
1-1	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 사업내용 구체화 후 위치, 규모, 예산확보 추진	추진중 (10%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018~2022년 추진계획 수립 - 자문단 구성 근거 마련 - 국내·외 포토존 사례 수집 - 포토존 조성 전문가 의견수렴 - 해양관광매력물 개발 및 관광 특화전략 연구 용역 진행	문화관광과 ☎4372 p.19
1-2	<input type="checkbox"/> 수영구 도서관 재건립 - 2020년 11월 개관 예정 - 남천서로 33 외 2필지 - 연면적 3,900㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 19,712백만원 (당초사업비 13,471백만원)	추진중 (40%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 설계공모작 선정 - 2018.11월 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2019. 3월 : 주민설명회 개최 - 2019.10월 : 설계용역 최종보고회 개최 - 2019.12월 : 기본·실시설계용역 완료	문화관광과 ☎4064 p.21
1-3	<input type="checkbox"/> 수영구 광안도서관 신축 - 2020년 개관 예정 - 광안4동 1148-3 일원 - 연면적 990㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 3,869백만원	추진중 (30%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 9월 : 특별교부세 결정(5억) - 2018.11월 : 건립추진계획 수립 - 2019. 6월 : 실시설계 용역계약 체결 - 2019.11월 : 설계용역 최종보고회 개최 - 2019.12월 : 설계용역 준공 - 2019.12월 : 건축공사 및 공종별 공사발주 등 계약 체결	문화관광과 ☎4065 p.23
1-4	<input type="checkbox"/> 망미2동 복합주민센터 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 망미2동 257-2 일원 - 연면적 1,960.13㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 5,024백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 2018. 9월 : 공사 발주 - 2019. 4월 : 공정추가에 따른 공기 연장 계약 변경 - 2019.10월 : 건립 준공 - 2019.11월 : 임시동사에서 신청사로 이전 - 2019.11월 : 개관식 및 업무개시	총무과 ☎4112 p.25
1-5	<input type="checkbox"/> 민속보존회 지원 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화 - 총사업비 370백만원 (당초사업비 466백만원)	추진중 (62%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 총원 지급금액(370백만원) 중 201.7백만원 지원 - 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급 완료 (56.7백만원)	문화관광과 ☎4067 p.27

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-6	<input type="checkbox"/> 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충 - 2018년 ~ 2019년 - 부지면적 600㎡ - 총사업비 6,000백만원 (당초사업비 6,000백만원)	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 추진방안 및 대상부지 검토 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 부지매입예산 확보 난항	문화관광과 ☎4067 p.28
1-7	<input type="checkbox"/> 청소년 문화의 집 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 77 - 연면적 995㎡ - 지상 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,595백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 청소년 문화의 집 개관	복지서비스과 ☎4612 p.29
1-8	<input type="checkbox"/> 수영강변 한전주 지중화 사업 추진 - 2019년 12월 완료 예정 - 수영로741번길 12 일원 - L=900m, 한전주 24기 - 총사업비 1,450백만원 (당초사업비 925백만원)	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 6월 : 자중사업 이행합의체결 - 2018.11월 : 실시설계 시행 - 2019. 5월 : 한전선로 매설공사 착공(한전) - 2019.12월 : 전주철거 및 보도 복구 공사 완료	건설과 ☎4692 p.30



○ 복지·보건분야 : 10개 사업(완료5, 추진중5, 미착수0), 71%






사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-1	<input type="checkbox"/> 노인장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입 - 2019년 ~ 2020년 - 25인승 버스 각 1대 구입 - 총사업비 280백만원 (당초사업비 160백만원)	추진 중 (50%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 시비 보조금예산 확보 노력 - 노인복지관 셔틀버스 구입예산 확보 - 노인복지관 기능보강사업비 보조금 200백만원 교부완료 (셔틀버스 1대 구입 및 어르신 승용차량 1대 구입)	복지서비스과 ☎4368 ☎4164 p.35
2-2	<input type="checkbox"/> 수영역 14번 출구 엘리베이터 /에스컬레이터 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 3,000백만원	추진 중 (10%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 사업추진기관과 협의 진행 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사업추진기관인 부산교통공사와의 의견차 조율 필요	교통행정과 ☎4556 p.37
2-3	<input type="checkbox"/> 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원 - 2018년 ~ 2019년 - 총사업비 200.1백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 노인복지시설(경로당) - 2018. 9월 : 추경예산 편성 - 2019. 3월 : 사업완료 (경로당 88개소 지원) ○ 장애인복지시설 - 2018. 12월 : 사업완료(16개소 지원)	복지서비스과 ☎4362 ☎4164 p.38

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-4	<input type="checkbox"/> 보훈가족 지원사업 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 보훈단체 보조금 지원 확대 - 보훈회관 시설유지관리 등 - 총사업비 7,616백만원	추진중 (40%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.11월 : 보훈회관 스프링클러 설치공사 준공 (220백만원) - 2018.7월~2019.6월 : 보훈대상자 수당, 보훈단체 보조금 등 지급 - 2019.4월 : 보훈회관 시설물 개보수 공사준공	주민생활 지원과 ☎4314 p.40
2-5	<input type="checkbox"/> 수영구 노인복지관 분관 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 장대골로 75-4 - 연면적 2,018㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,723백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 건립예산 확보(5,773백만원) - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018.12월 : 지상2층 공사완료 - 2019. 9월 : 건립 준공	복지서비스과 ☎4363 p.42
2-6	<input type="checkbox"/> 수영구 장애인복지관 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 광안4동 1148-4 - 연면적 1,769.05㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,420백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 건립예산 확보 - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018. 1월~2019. 8월 : 건축공사 - 2019. 9월~11월 : 내부설치공사 - 2019. 9월 : 준공 및 운영 개시	복지서비스과 ☎4163 p.43
2-7	<input type="checkbox"/> 야간주간 돌봄서비스 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 시간제돌봄 정부지원시간 확대 (연 600시간→720시간) - 서비스 지원대상 확대 (중위소득 120%→150%) - 총사업비 10,322백만원 (당초사업비 10,087백만원)	추진중 (87%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 아이돌봄지원사업 예산및돌보미 수 증가 · 예산 : 637백만원→1,836백만원 · 돌보미 수 : 80명→108명 - 아이돌봄지원사업 신청가정수 증가 · 신청가정수 : 114가구→192가구 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 수요 대비 아이돌보미가 적어 대기자가 있고, 대기자 95%가 어린이집·유치원 하원 시간에 이용을 희망하고 있음 → 추가예산 확보를 통한 아이돌보미 양성 추진	복지서비스과 ☎4351 p.45
2-8	<input type="checkbox"/> 발달장애인 지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 발달재활서비스 지원대상자 확대 - 총사업비 1,645백만원 (당초사업비 1,035백만원)	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 신규지원 18명(자폐 7, 지적 11) - 발달재활서비스 지원대상자 확대 - 발달재활서비스 제공 - 수영구 내 발달재활서비스 제공 기관 6개소 확보	복지서비스과 ☎4162 p.47




사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-9	<input type="checkbox"/> 장애인 지원사업 강화 - 2019년 ~ 2022년 - 장애인 복지증진을 위한 다양한 프로그램 운영 - 총사업비 160백만원	추진중 (20%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시 - 장애인 복지관 운영	복지서비스과  4164 p.49
2-10	<input type="checkbox"/> 보건소 치매안심센터 운영 - 2018년 ~ 2022년 - 치매안심센터 전용공간 (565.18㎡) 확보 및 운영 - 총사업비 4,768.3백만원 (당초사업비 3,819백만원)	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.12월 : 치매안심센터 설치 완료 및 정식 개소 (지상3층, 사업비 573백만원) - 2019. 1월~ : 치매안심센터 운영 - 치매환자 등록관리/조호물품 제공 : 1,176명/5,360명 - 치매 선별·진단·감별 검사자 수 : 7,324명 - 치매안심센터 프로그램 이용자수 : 11개 프로그램 6,426명 - 치매파트너·플러스 양성 : 712명	보건소  5640 p.51





○ 교육·보육분야 : 6개 사업(완료4, 추진중1, 미착수1), 82%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-1	<input type="checkbox"/> 고등학생 무상교복 지원 - 2018년 ~ 2022년 - 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상 교복구입비 30만원 지원 - 총사업비 1,465백만원 (당초사업비 2,739백만원)	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 보건복지부 사회보장 제도 신설 협의완료 조례제정, 예산편성 - 2019. 3월~ : 교복구입비 지원신청 접수 및 지급 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 교복지원대상자에게 직접 홍보를 하기 위한 정보 수집에 어려움 → 지원대상자가 빠짐없이 신청 하도록 지속적인 홍보 추진 <input type="checkbox"/> 공약변경사항 - 시 교육청 중학생 교복지원사업 추진에 따른 공약명 및 지원대상 변경 (중·고등학생 → 고등학생)	창조도시 교육추진단  4129 p.55









사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-2	<input type="checkbox"/> 수영구 평생학습관 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 55 일원 - 연면적 993,94㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,851백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 평생학습관 개관	창조도시 교육추진단 ☎4122 p.57
3-3	<input type="checkbox"/> 호암초 다목적강당 건립 지원 - 2019년 ~ 2021년 - 다목적강당 등 805㎡ - 총사업비 3,000백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 市 교육협력과 2020년 다목적강당 지원사업에 호암초등학교는 지원 대상에서 제외('19년 타 사업 지원) → 문화체육관광부 개방형 다목적 학교체육관 건립사업 공모 추진	창조도시 교육추진단 ☎4129 p.59
3-4	<input type="checkbox"/> 수영구 육아종합지원센터 건립 - 2019년 4월 준공 예정 - 광안4동 738-1 - 연면적 1,269.7㎡ - 지상 4층 - 총사업비 5,513백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 4월 : 공사 준공 - 2019. 6월 : 개소 및 운영	복지서비스과 ☎4322 p.60
3-5	<input type="checkbox"/> 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 둘째, 셋째, 넷째이후 자녀 출산장려금 지원 확대 - 총사업비 1,967백만원	추진중 (90%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019.1~6월 : 출산장려금 지원 조례 개정 행정절차 이행 - 2019. 9월 : 출산장려금 지원 조례 개정 계획 수립 - 2019.10월 : 구의회 의결 - 2019.11월 : 개정조례 공포 - 2019.12월 : 출산장려금 지원확대 2020 본예산 편성	복지서비스과 ☎4321 p.62
3-6	<input type="checkbox"/> 국·공립 보육시설 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 국공립 어린이집 3개소 설치 - 총사업비 449백만원 (당초사업비 390백만원)	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 국공립 어린이집 2개소 설치 완료 · 2019. 3월 : 2개소 개원 · 센텀비스타동원, 망미이진캐스빌 - 국공립 어린이집 1개소 설치 완료 · 2019.10월 : 1개소 개원 · 수영 SK뷰 어린이집	복지서비스과 ☎4322 p.64




○ 교통·안전분야 : 10개 사업(완료1, 추진중7, 미착수2), 44%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-1	<input type="checkbox"/> 어린이 교통안전 스쿨존 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 어린이보호구역 확대 및 통합지정 후 시설물 설치 - 총사업비 800백만원	추진중 (75%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 9월 : 2018년 어린이보호구역 개선사업 시행 (바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초등학교) - 2019.10월 : 스쿨존 안전환경 정비사업 시행	교통행정과 ☎4556 p.69
4-2	<input type="checkbox"/> 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강 - 2018년 ~ 2022년 - 증설 160대, 보강 300대 - 총사업비 2,034백만원	추진중 (76%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018년 : 111대 구방법 증설(생활안전) : 40대 시방법 증설 : 10대 보강설치 : 61대 - 2019년 : 239대 방범용 증설·보강 : 123대 생활안전용 증설·보강 : 81대 시방법 12단계 증설 : 15대 민안초 등산로 증설 : 3대 망미SK뷰 주변 증설 : 16대 부경펄리스 앞 증설 : 1대	안전관리과 ☎4492 p.71
4-3	<input type="checkbox"/> 민락매립지 공영주차장 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 민락동 113-46, 113-50 - 대지면적 6,393㎡ - 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면 확대) - 총사업비 15,050백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 광안리해수욕장 수상관광호텔 사업계획 승인 시 주차장 증설 후 기부채납 계획되어 있음 ※ 수상관광호텔 준공기한 : 2022.6.13. - 지하 양수장 시설 이관 시 매립목적 변경에 따른 인가 필요 → 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 민자사업계획서 접수 시 검토 후 사업 결정	교통행정과 ☎4552 p.73
4-4	<input type="checkbox"/> 수변어린이공원 공영주차장 조성 - 2018년(사업완료) - 민락동 110-15, 162면 규모 - 총사업비 3,900백만원	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 공사 준공 - 2018.11월 : 주차장 운영 (부산시설공단)	교통행정과 ☎4552 p.75
4-5	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축 - 2018년 ~ 2022년 - 남천2주택재건축정비구역 - 300대 규모 지하주차장 - 비예산(민간투자사업)	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진 사항에 따라 이행여부 결정 → 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 사업 시행 시 주차장 조성 및 기부채납 협의	교통행정과 ☎4552 p.76
4-6	<input type="checkbox"/> 동별 주거지전용주차장 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 관내 주차환경개선지구 10개소 120면 - 총사업비 14,520백만원 (당초사업비 12,720백만원)	추진중 (40%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018년 : 18면 망미1동 457-7번지 18면 - 2019년 : 46면 망미동 441-19번지 7면 민락동 15-8번지 11면 수영동 157외 28면 - 부지매입완료 : 2개소	교통행정과 ☎4552 p.78

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-7	<input type="checkbox"/> 미세먼지 제어시스템 확립 - 2018년 ~ 2020년 - 미세먼지 저감을 위한 각종 사업 추진 - 총사업비 1,270백만원 (당초사업비 18백만원)	추진 중 (50%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 미세먼지저감 종합대책 수립(11월) - 비산먼지발생사업장 지도점검 실시 - 미세먼지 회피시설 예산확보(32백만원) - 운행차 배출가스 점검·감시 실시 - 공공기관 민원실 실내공기질 측정 - 고농도 미세먼지 대응 민간 실수차 압차 - 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 의거 미세먼지 측정기기 성능인증제 도입(2019. 8월 시행) 후 예산 필요 → 도입 후 세부사업 추진	환경위생과 ☎4392 p.80
4-8	<input type="checkbox"/> 망미지구 우수저류시설 설치 - 2020년까지 - V=26,800m ² , 게이트펌프 1개소 등 - 총사업비 22,400백만원	추진 중 (20%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 대체부지 확보를 위한 관련부서 협의 및 검토 (기획재정부, 부산지방경찰청) → 수영경찰서 신축 예정부지 지하공간 활용방안 협의 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 기존 설치예정지 이해당사자 시설설치 반대로 인한 추진 애로 → 주택재개발정비사업 등 대단위 사업 시행시 사업부지 내 설치 추진	건설과 ☎4692 p.82
4-9	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업 - 2021년까지 - 광안리해수욕장 (민락동 하수중계펌프장 인접) - 저류형 V=3,300m ³ - 총사업비 8,251백만원 (당초사업비 8,332백만원)	추진 중 (40%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 4월 : 시설위치 결정 - 2018. 7월 : 신기술(특허) 공법 심의위원회 개최 - 2018.12월 : 도시관리계획위원회 개최 및 환경부 설계승인 - 2019. 6월 : 공사착공, 일시중지 (해수욕장개장기간민원발생우려일시중지) - 2019. 9월 : 공사재개 - 2019.12월 : 공사 추진 중	건설과 ☎4942 p.84
4-10	<input type="checkbox"/> 백산허리길 도로 확대 - 2020년까지 - 민락동 355-1 일원 - L=698m, B=5~7m → 20m - 10,000백만원	추진 중 (40%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 8월 : 지방토지수용위원회 개최 - 2018.10월 : 총사업비 변경요청 (행정안전부, 100억→170억) - 2019. 6월 : 토지보상금 공탁 등 - 2019.12월 : 설계용역 발주 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사업비, 토지보상비 등 증가로 총사업비 변경이 필요하나, 행정안전부 총사업비 변경 불가 통보 → 당초 사업비 내에서 대안설계 실시	건설과 ☎4712 p.86

○ 생활·경제분야 : 7개 사업(완료2, 추진중3, 미착수2), 55%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-1	<input type="checkbox"/> 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거 - 2018년 ~ 2022년 - L=29.8m, B=3m, H=4.5m - 총사업비 100백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 수반되며 지방경찰청 소관사항 - 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 증가를 우려함 → 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치) 추진 시 육교 철거 및 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적 검토	건설과  4694 p.91
5-2	<input type="checkbox"/> 반려견 놀이공원 조성 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 300백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 타 시도 사례 수집 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견놀이터 조성 가능, 우리는 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 공원으로 공원 내 조성 불가 → 토지매입비용(1억) 확보 필요 규모는 최소 1,000㎡ 이상 - 주택지 인근 조성 시 반려견 놀이시설에 대한 부정적 인식으로 주민반대가 심할 것으로 예상 → 부지확정 전 설문조사공청회 실시로 주민의견 충분히 수렴	일자리 경제과  4503 p.93
5-3	<input type="checkbox"/> 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성 - 2019년 12월 준공 예정 - 망미동 601-1 일원 - 연면적 1,997.08㎡, 지상 2층 - 총사업비 9,000백만원	추진중 (95%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 3월 : 공사 발주 - 2018. 4월 : 착공 및 기공식 - 2018.12월 : 공사 진행 - 2019.12월 : 2차분 공정 95% 완료 - 2020. 2월 준공 예정	창조도시 교육추진단  4891 p.95
5-4	<input type="checkbox"/> 수영구 국민체육센터 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 77 - 연면적 4,995.54㎡ - 지하 2층, 지상 3층 - 총사업비 24,185백만원 (당초사업비 23,705백만원)	사업완료 (100%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 개관 및 운영	총무과  4932 p.96

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-5	<input type="checkbox"/> 수영구 일자리종합센터 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 ~ 2022년 - 취·창업지원 서비스 강화 - 총사업비 670백만원 (당초사업비 617백만원) 	<p>사업완료 (100%)</p> 	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 3월 일자리종합센터 개소 (취업상담사 4명, 창업상담사 1명, 구인구직개척단 2명 근무) - 취·창업지원프로그램 운영 (구인구직 만남의 날, 동부산권 채용박람회 개최, 찾아가는 취업 지원 상담소 운영 등) - 창업설명회 2회 개최 - 창업가이드북 제작 배부(200부) <input type="checkbox"/> 공약변경사항 <ul style="list-style-type: none"> - 취창업지원센터를 수영구청 1층으로 이전하고 일자리종합센터로 확대 운영하고 있어 공약명 변경 (취창업지원센터→일자리종합센터) 	<p>일자리 경제과 ☎4821</p> <p>p.98</p>
5-6	<input type="checkbox"/> 사회적(마을)기업 자립지원 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 ~ 2022년 - 사회적·마을기업 신규발굴 및 네트워크 구축 등 - 총사업비 4,435백만원 	<p>추진중 (55%)</p> 	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적기업 5개 신규 발굴 - 마을기업 1개 신규 발굴 - 청년일자리사업 14명 지원 - 수영구 사회적경제기업 주간행사 신설 및 개최 : 2회(2018-2019년 각1회) - 사회적경제기업 간담회 개최 : 2회 	<p>일자리 경제과 ☎4825</p> <p>p.100</p>
5-7	<input type="checkbox"/> 재건축·재개발 적극 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 ~ 2022년 	<p>추진중 (35%)</p> 	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 착공 1건(광안2재건축) - 2019년 착공 1건(남천2재개발), 준공 2건(남천2재건축, 망미2재개발), 관리처분계획인가 1건(광안2재개발) 	<p>건축과 ☎4661 ☎4662</p> <p>p.102</p>

V. 분야별 평가내용

- 1. 문화·관광 8건**
- 2. 복지·보건 10건**
- 3. 교육·보육 6건**
- 4. 교통·안전 10건**
- 5. 생활·경제 7건**



1. 문화 · 관광

- 1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치
- 1-2. 수영구 도서관 재건립
- 1-3. 수영구 광안도서관 신축
- 1-4. 망미2동 복합주민센터 건립
- 1-5. 민속보존회 지원 강화
- 1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충
- 1-7. 청소년 문화의 집 건립
- 1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치

문화관광과 관광진흥계(백영미, 610-4372)

광안리해수욕장에 세계 최고의 포토존을 설치하여 세계인이 즐겨 찾는 글로벌 관광도시 수영을 조성코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. 1. ~ 2022. 6. 30.(4개년)
- 사업규모 : 위치, 규모 추후 선정(포토존 개발 연구용역 결과 도출 및 주민 공감대 형성 후 선정)
- 총사업비 : 사업내용 구체화후 예산확보 추진
- 사업내용 : 광안리가 가지고 있는 꿈·낭만·젊음의 스토리를 담은 상징성 있는 세계적인 포토존 설치
- 추진일정

구 분	2018~2019년	2020년	2021년	2022년
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> • 포토존 사례수집 • 포토존 스토리 구상 • 자문단 구성 근거 마련 • 포토존 개발 연구 용역 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 포토존 개발 연구용역 결과에 따른 로고맵 수립 • 주제, 위치, 사업규모 확정 • 사업예산 확보 방안 마련 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 작품공모 	<ul style="list-style-type: none"> • 포토존 조성

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			10%

□ 세부추진내용

- 연도별·시기별 세부추진실적 작성
 - ▷ 2018~2022년 추진계획 수립
 - 포토존 조성 자문위원단 구성, 국내·외 사례수집, 스토리구상, 주민 설문조사, 예산확보 방안, 작품공모 등

- 포토존 설치 자문단 구성 근거 마련
 - ▷ 수영구 관광진흥조례 제12조(운영세칙)
 - ▷ 2018년 제2회 수영구 관광진흥위원회 심의의결
- 국내·외 포토존 사례 수집
 - ▷ 예술성 작품성이 뛰어나 포토존이 된 작품
 - ▷ 문학적·지역적 스토리를 담아 포토존이 된 작품 등
- 광안리해수욕장 포토존 구성에 대한 전문가 의견수렴 등
 - ▷ 2019년 제1회 수영구 관광진흥위원회 회의
- 광안리해변 해양관광매력물 개발 및 관광특화전략 연구용역 추진
 - ▷ 포토존 개발 주요과업 선정 → 콘텐츠, 개발 전략 도출 등
 - ▷ 지역여건, 환경, 스토리텔링 등에 기반한 포토존 설치 추진

문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 포토존의 목적, 기능에 대한 실체화에 시간적 소비가 많음
 - 작품성 있는 세계적 포토존에 대한 정의 등 사전 검토작업 중요
 - 국내·외 수집자료를 토대로 우리구의 상징성과 부합하는 포토존 설치
 - 단순 조형물보다 스토리 또는 기능을 담아 작품 설치에 대한 주민 공감대 필요
- 개선방향
 - ▷ 폭넓은 국내외 포토존 사례 모집
 - ▷ 공무원, 전문가, 주민들이 모여 포토존 설치방향에 대한 충분한 협의
 - ▷ 포토존 개발 연구 용역 등을 통한 콘텐츠, 개발 전략 도출

향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 향후 추진계획(연도별 계획)
 - ▷ 2020년 : 포토존 개발 용역 결과 도출 및 반영, 로드맵 수립(예산확보 방안, 포토존 주제·위치, 사업규모 등 기본 방향 설정 검토)
 - ▷ 2021년 : 작품공모(국내공모 우선, 선정수준 미달 시 해외공모) 주민 및 내부검토 최종 의견 수렴, 실행계획 수립
 - ▷ 2022년 : 포토존 조성 추진(설계용역 및 공사시행, 홍보)

1-2. 수영구 도서관 재건립

문화관광과 문화예술계(김재경, 610-4064)

1986년 건축된 건물로 내진성능 평가 결과 재난위험시설 D등급 판정 등 기존 건물의 노후화와 공간협소로 자료의 이용과 공간 부족 등 이용자들의 정보욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 공공 도서관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 수영구 남천서로 33
- 사업규모 : 연면적 4,290㎡ / 지하1층, 지상4층
- 사업내용 : 기존 수영구도서관 재건축
- 총사업비 : 19,712백만원(국비 5,388, 시비 4,041, 구비 10,283)
 - ▷ 건립비 13,471백만원 ☞ 공사 12,076 설계 782 감리 613
 - ▷ 기타부대비 1,438백만원 / 부지(구유지) 4,803백만원

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
19,712	5,388	4,041	10,283		14,504	3,595	2,697	8,212	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
19,712	5,491	4,403	4,610	2,426	2,782		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 3. 6. 설계용역 중간보고회(1차) 개최
- ▷ 2019. 3. 27. 주민설명회 개최
- ▷ 2019. 6. 25. 설계용역 중간보고회(2차) 개최
- ▷ 2019. 10. 18. 설계용역 최종보고회 개최
- ▷ 2019. 12. 16. 기본·실시설계용역 완료

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2020. 1. 착공
- 2021. 하반기 준공 및 개관

1-3. 수영구 광안도서관 신축

문화관광과 문화예술계(박채령, 610-4065)

인구수 약 7만명, 초등학교 3곳, 중학교 4곳, 고등학교 1곳이 밀집된 광안지역의 독서 편의 증진과 주민들이 다양하고 광범위한 지식 정보에 지역적 격차 없이 쉽게 접근할 수 있도록 광안도서관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 부지 700㎡, 연면적 902.26㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업내용
 - ▷ 기존 도서관(수영구 도서관, 망미분관)이 남천동·망미동에 편중되어 있어 독서 수요가 많고 교육시설이 밀집된 광안동 독서환경 개선을 위하여 광안도서관 신축
- 총사업비 : 3,869백만원(국비 1,120, 시비 840, 구비 1,909)
 - ▷ 건립비 2,800백만원 ☞ 공사 2,615 설계 153 감리 32
 - ▷ 기타부대비 600백만원, 부지(구유지) 469백만원

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,869	1,120	840	1,909	-	3,269	1,120	840	1,309	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
	469	-	112	-	-	-	-

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ '19. 7. : 설계용역 착수계 제출
- ▷ '19. 10. : 수영구청 경관심의 요청
- ▷ '19. 11. : 건축협의를 접수
- ▷ '19. 11. : 설계용역 최종보고회 개최
- ▷ '19. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)
- ▷ '19. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주 및 계약체결

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 도서관 연면적 확보위해 증축 계획되어 장애인복지관·노인복지관 분관 준공 후 착공 결정으로 사업기간 연장됨

○ 개선방향

- ▷ 향후 사업추진 일정 단축 노력으로 사업기간 연장 최소화

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- '20. 1. : 공사착공
- '20. 11. : 공사준공
- '20. 12. : 개관준비

1-4. 망미2동 복합주민센터 건립

총무과 자치행정계(진호인, 610-4112)

지역주민이 행정·복지·문화 등 다양한 서비스를 한 장소에서 편리하게 누릴 수 있는 행정인프라 구축사업으로 2019.11월 준공 및 개소 완료

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 망미2동 257-2번지 일원
- 사업규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 1,960.13㎡
- 사업내용 : 동 행정복지센터, 복합커뮤니티센터, 생활문화센터
- 협조부서(기관) : 창조도시교육추진단, 문화관광과
- 총사업비 : 5,024백만원(국비 600, 시비 730, 구비 3,694)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,024	600	730	3,694		5,024	600	730	3,694	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4,959		627	4,332				

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 4월 : 공정추가 및 물량증가에 따른 공기연장 계약변경
- ▷ 2019. 4월 : 망미2동 임시동사 임대차기간 연장계약
- ▷ 2019.10월 : 망미2동 복합주민센터 건립 준공
- ▷ 2019.11.2.~11.3. : 임시동사에서 신청사로 이전 ※ 11.4 : 업무개시
- ▷ 2019.11.11. : 망미2동 복합주민센터(행정복지센터+구락생활문화센터)
개관식 개최

□ 향후계획

- 동 행정복지센터 : 동사(지하1~지상2층) 시설유지관리
- 문화관광과 : 구락생활문화센터(3~4층) 대관 및 시설유지관리

1-5. 민속보존회 지원 강화

문화관광과 문화예술계(이민수, 610-4067)

연차별 계획에 따른 사업비 확보를 적극적으로 추진 중이며, 일부 사업의 경우(관람객석 지붕정비)는 사업완료에 따른 공약 실현 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업내용 : 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화로 보존단체의 자긍심 고취
- 협조부서(기관) : (사)수영고적민속예술보존협회
- 총사업비 : 370백만원(시비 99, 구비 271)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			62%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
370	-	99	271	-	201.7	-	99	102.7	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
201.7	-	145	56.7	-	-	-	-

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 총원 지원금액(금370백만원) 중 201.7백만원 지원 (54.5%)
 - ▷ 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급 완료(56.7백만원)
 - 수영전통 민속교류(16,000천원), 민속예술제(5,200천원), 무형문화재 공연 영상 및 사운드 제작(10,000천원), 상설공연 지원(15,000천원), 생생문화재 사업(10,500천원)

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 연차별 계획에 따른 민속보존회 지원 강화
 - ▷ 무형문화재 공모사업 적극 발굴, 지원, 선정 추진
- 연차별 계획에 따른 민속보존회 지원 강화
 - ▷ 무형문화재 공모사업 적극 발굴, 지원, 선정 추진

1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충

문화관광과 문화예술계(이민수, 610-4067)

예능분야 무형문화재 전수교육관 확충을 위하여 대상부지를 검토하고 있으나, 소요예산의 미확보로 인한 난항을 겪고 있으므로 부지매입을 위한 시비지원이 강화될 필요가 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업규모 : 부지면적 600㎡ ☞ 부산전통예술관(기능분야)에 준함
- 사업내용 : 예능분야 무형문화재 전수교육관 확충
- 총사업비 : 6,000백만원(추정)(국비 2,500, 시비 3,350, 구비 150)

☐ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 추진방안 검토 및 대상부지 검토
- 2019년 : 대상부지 확정, 국·시비 확보 추진
- 2020년 : (필요시)부지매입 ○ 2021년 : 착공 ○ 2022년 : 준공

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		-

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,000	-	-	-	1,000	2,500	2,500	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,000	2,500	3,350	150	-	-	-	-	-	-

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)

- ▷ 부지매입을 위한 추정예산의 확보 난항 발생
 - 문화재보호구역의 매입하여 부지 확보를 추진하고 있으나, 2019년 부지확보를 위한 추정예산의 시비 미교부

- 개선방향

- ▷ 부지매입비에 대한 시비지원을 강화할 필요 있음

1-7. 청소년 문화의 집 건립

복지정책과 아동청소년계(박명이, 610-4612)

일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한 여가활동 보장을 위한 수련 및 문화 복지시설 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동)
- 사업규모 : 연면적 995㎡, 지하1층/지상3층
- 사업내용

층 별	면적(㎡)	주요 시설	비고
지하1층	42.22	복도, E/V	
1층	314.58	북카페, 동아리실(댄스), 다목적실	청소년문화의집, 진로교육지원센터 방과후아카데미
2층	319.86	사무실, 직업체험실, 미디어체험실, 방과후아카데미	
3층	319.86	사무실, 심리검사실, 개인상담실, 꿈드림 교육실	

- 협조부서(기관) : 총무과, 창조도시교육추진단
- 총사업비 : 2,595백만원[국비 1,056, 시비 72, 구비 1,467(특교세 1,400)]

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,595	1,056	72	1,467		2,595	1,056	72	1,467	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,595	749	1,061	785				

□ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 2019. 6월 : 수영구 청소년문화의 집 준공
 - ▷ 2019. 7월 : 수영구 청소년문화의 집 개관

1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

건설과 토목계(박민근, 610-4694)

수영강변 일원에 설치되어 있는 전주 및 통신주를 지중화하여 미관을 개선하고 아름다운 수영강변의 환경을 조성함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영로 741번길 12(수영강변 일원)
- 사업규모 : L=850m (대상 : 콘크리트 한전주 24기)
- 전력현황 : 특고압 22.9KV, 전선 162mm² 지중화 시행
- 총사업비 : 1,450백만원(시비 725) ※ 우리구분담금-공사비 50%(725백만원)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,450	-	725	725	-	1,450	-	725	725	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
725	-	580	145				

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2018. 3월 : 특별조정교부금 교부 통보(시 예산담당관실)
⇒ 교부금액 725백만원
- ▷ 2018. 6월 : 지중화사업 이행협약 체결(우리구↔한전, 통신사업자)
- ▷ 2018. 11월 : 한전 지중화공사 실시설계 시행

○ 2019년

- ▷ 2019. 5월 : 한전·통신 관로 지중화공사 시행
- ▷ 2019. 8월 : 창조도시과 경관조명 전기관로 지중화공사 시행
- ▷ 2019. 12월 : 전주 철거 및 지중화 보도복구공사 완료

□ 향후추진계획

- ▷ 수영강변 지중화구간 보도 및 자전거도로 등 주민편의 시설물
지속적 유지관리



2. 복지 · 보건

- 2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료 셔틀버스 도입
- 2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치
- 2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원
- 2-4. 보훈가족 지원사업 강화
- 2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립
- 2-6. 수영구 장애인복지관 건립
- 2-7. 야간·주간 돌봄서비스 확대
- 2-8. 발달장애인 지원 확대
- 2-9. 장애인 지원사업 강화
- 2-10. 보건소 치매안심센터 운영

2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입

가족행복과 노인복지계(김아람, 610-4168)

가족행복과 장애인복지계(전은하, 610-4164)

수영구 노인·장애인 복지관에 무료 셔틀버스를 운영하여 노인과 장애인의 이동 편의성을 보장하고 사회참여 기회를 확대하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
- 사업규모 : 25인승 버스 각 1대 구입
- 사업내용 : 노인복지관, 장애인복지관 이용자 무료셔틀버스 운행
- 총사업비 : 280백만원 (시비 100%)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
280		280			200		200		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
280			200	80			

☐ 세부추진내용

[노인복지관]

- 2019년

▷ 광안노인복지관 운영 시작

- ▷ 노인복지관 기능보강사업비 보조금 200,000,000원 교부완료
 - 후원금으로 셔틀버스 1대 구입, 보조금으로 어르신 송영차량 및 사무실 차량 추가구입, 프로그램실 장비 설치

○ 2020년

- ▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사

○ 2020년 이후 : 무료 셔틀버스 지속 운행

[장애인복지관]

○ 2018년 : 해당없음

○ 2019년

- ▷ 장애인복지관 개관, 운영 시작
- ▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사
- ▷ 사회복지시설 기능보강사업 장비보강 신청(시비 보조)

□ 문제점 및 개선방안

- 2019년 수영구 장애인복지관 개관 후 복지관 이용자의 욕구 및 장애 유형 등을 파악하여 버스 규격 등을 결정, 견적서 등을 시에 제출하여 2020년 예산을 확보하고자 추진 중임.

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 기존 수영구노인복지관과 광안노인복지관 이용자 수 및 유형 등을 파악하여 노선 및 운영대수 등 운영방안 마련
- 사회복지시설 기능보강사업(장비보강) 시비 보조 예산지원 조건에 해당되어 2020년도 기능보강사업 보조금 교부대상에 선정되도록 적극 추진 중임.

2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치

교통행정과 교통행정계(김경록, 610-4556)

교통약자인 노인, 장애인의 공공시설 접근을 향상시키고 안전사고 위험을 감소시켜 보다 쾌적하고 안전한 보행 환경을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업내용 : 수영역 14번 출구 엘리베이터 또는 에스컬레이터 설치
- 주관부서(기관) : 부산교통공사
- 총사업비 : 3,000백만원(시비)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.30.현재
	○			10%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,000		3,000							

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,000					3,000		

☐ 세부추진내용

- 현장조사 및 사업추진기관(부산교통공사) 협의

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 현재 계단위치는 보도 폭이 좁고 지하철 출입계단의 구조(절곡형)에 따라 이동편의시설(E/V, E/S) 설치가 어려움.
 - ▷ 사업추진기관인 부산교통공사에서 사업비(30억)부족 등 사업시행에 부정적인 의견으로 사업추진에 애로사항이 있음.

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 부산광역시, 부산교통공사 협의

2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원

가족행복과 노인복지계(남지윤, 610-4362)

가족행복과 장애인복지계(전은하, 610-4164)

노인·장애인 등 건강취약계층에 대한 미세먼지 보호설비를 지원하여 (초)미세먼지 피해를 사전에 예방하고 건강한 생활을 보장하고자 함

□ 사업개요

[노인여가복지시설(경로당)]

- 사업기간 : 2018. 8 ~ 2019. 3
- 사업규모 : 경로당 88개소
- 사업내용 : 경로당 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 200.1백만원

[장애인복지시설]

- 사업기간 : 2018. 10. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 사업규모 : 장애인복지시설 16개소
- 사업내용 : 장애인복지시설 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 10백만원

▷ 후원사업 발굴 ☞ 관내 기업 지역사회공헌사업 성금 기탁금 활용

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
210	50	100	50	10	210	50	100	50	10

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
176	0	10	166	0	0	0	0

☐ 세부추진내용

[노인여가복지시설(경로당)]

○ 2018년

- ▷ 2018. 9. 28. : 2018년도 2차 추경예산편성
- ▷ 2018. 11. 13. : 경로당 공기청정기 보급사업 추진
- ▷ 2018. 11. 27. : 입찰공고 요청
- ▷ 2018. 12. 1.~30. : 사전규격 공개 및 공고문 작성

○ 2019년 : 목표 진도율 100%완료

- ▷ 2019. 1월 : 입찰공고
- ▷ 2019. 3월 : 관내 경로당 88개소 공기청정기 보급 완료

[장애인복지시설]

○ 2018년 : 목표 진도율 100%

- ▷ 공기청정기 지원 수요조사 및 계획 수립
- ▷ 공기청정기 구매, 장애인복지시설 배부

☐ 향후계획

- 경로당 회장단 교육을 통한 기기관리 철저 안내
- 공기청정기 유지관리업체 계약으로 점검 및 교체 실시
 - 어르신들의 기기관리의 어려움을 고려하여 청소 및 필터교체 등 유지관리 지속적으로 지원
- 공기청정기 필터 관리 및 교체여부 수시 확인

2-4. 보훈가족 지원사업 강화

복지정책과 복지기획계(최미옥, 610-4314)

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 명예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈대상자 지원 지속 추진 및 보훈회관 강당 환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기본방침

- ▷ 3개 분야 9개 사업 지속 추진
- ▷ 보훈단체 보조금 지원, 시설유지관리 분야 점진적 확대

○ 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월(연중 지속)

○ 사업내용

- ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진
- ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
 - 보조금 지원 강화 : 중 22백만원(2020년 10백만원, 2022년 12백만원)
- ▷ 보훈회관 시설노후화에 따른 시설유지관리 분야 점진적 확대
 - 스프링클러설비 설치 공사 : 220백만원(2018년 하반기)
 - 시설물 유지 보수 : 중 16백만원(2019년)
 - 시스템에어컨 구입 : 중 25백만원(2022년 이후)
- ▷ 보훈가족 인정감 고취
 - 시분청 행사시 참석대상 추천, 복지의 달, 구민견기대회 등 초청

○ 총사업비 : 7,616백만원 (시비 6,341, 구비 1,275)

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			40%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,616		6,341	1,275		2,533		1,995	538	

연도별 사업비							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
7,616		1,358	1,175	1,211	1,242	1,286	1,344

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진
 - 참전유공자 명예수당 지원 : 10,325명 831백만원
 - 보훈명예수당 지원 : 1,159명 35백만원
 - 참전유공자 사망위로금 지원 : 67명 13백만원
 - 독립유공자 지원(3.1절,광복절) : 71명 7백만원
 - 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 640명 5백만원
- ▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 104백만원
- ▷ 보훈회관 시설물 유지관리
 - 공 사 명 : 수영구 보훈회관 강당 개보수 공사
 - 공사기간 : 2019. 3. 18. ~ 4. 1.
 - 위 치 : 광남로10번길 4(남천동,보훈회관)
 - 공사규모 : 2층 강당(114.51㎡)
 - 공사내용 : 보훈회관 2층 강당 벽체 및 바닥 교체 공사 등
 - 소요예산 : 16,000천원(구비)
 - 세부 추진실적
 - 2019. 3. 6. : 보훈회관 강당 개보수 공사 건의
 - 2019. 3. 18. : 공사 착공
 - 2019. 4. 1. : 공사 준공
 - 공공근로 인력 지원 : 2019.1~3단계 6명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)
- ▷ 보훈가족 인정감 고취
 - 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 국가유공자 833명

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 연도별 세부 추진계획에 따라 연차적으로 추진하겠음

2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립

가족행복과 노인복지계(정은연, 610-4363)

연차적 노령사회 진입에 따라 노인의 문화적 욕구를 해소하고 활기차고 행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지관 분관 건립의 정상 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-8(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사업내용 : 수영구 노인복지관 분관 건립
- 협조부서(기관) : 부산광역시, 수영구 건축과
- 총사업비 : 6,723백만원(시비 1,700, 구비 5,023)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,723		1,700	5,023		6,723		1,700	5,023	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,723	4,073	1,700	950				

☐ 세부추진내용

- 2019.09.02. : 준공

☐ 향후추진계획

- 광안노인복지관 개관 및 운영 : 2020.01.01. ~

2-6. 수영구 장애인복지관 건립

가족행복과 장애인복지계(서보은, 610-4163)

장애인복지사업의 중추적 역할을 수행할 장애인복지관을 건립하여 2019년 9월부터 운영 중이며, 다양한 프로그램 개설 등 장애인 재활 서비스를 지원하고 있음.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,769.05㎡, 지하1층/지상4층
- 시설배치

층별	연면적	주요용도
지하1층	534.76㎡	자원봉사자대기실, 재활용품보관실, 주차장
지상1층	243.87㎡	샤워실, 탈의실, 홀 및 휴게실(안내데스크)
지상2층	376.29㎡	사무실, 다목적실, 재활상담실, 감각통합실, 체력단련실
지상3층	376.29㎡	주간보호실, 집단활동실, 직업·미술·언어재활실
지상4층	237.84㎡	식당, 주방, 홀, 옥상정원

- 총사업비 : 6,420백만원(시비 4,891, 구비 1,529)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,420		4,891	1,529		6,420		4,891	1,529	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,420	995	253	5,172				

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 장애인복지관 건립공사 추진
 - 2018. 1월 ~ 2019. 8월 : 건축공사
 - 2019. 9월 ~ 11월 : 벽장 등 내부 설치공사 및 집기구입
- ▷ 장애인복지관 위탁법인 위탁협약서 작성 : 2019. 6월
 - 위탁법인 : 사회복지법인 청전
 - 위탁기간 : 2019. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 지역 장애인과 지역주민들을 위한 다양한 프로그램을 개설하여 장애인식개선 등 양질의 장애인 재활서비스 제공

2-7. 야간,주간 돌봄서비스 확대

가족행복과 여성가족계(안예진, 610-4351)

만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미가 직접 방문하여 돌봐주는 돌봄서비스로서 지속적으로 이용가정이 늘어나고 있는 추세이며, 돌보미 추가 모집으로 더욱 편리하고 신속하게 이용가정의 맞춤형 돌봄시간 서비스를 제공하고자 함.

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업내용 : 만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미 지원
- 총사업비 : 10,322백만원(국비 7,225 시비 3,097)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			87%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,836	1,285	551			1,836	1,285	551		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
10,322	673	673	1,763	1,836	1,850	2,000	2,200

☐ 세부추진내용

- 2019년

- ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 대상자 확대
 - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대(연 600시간 → 연 720시간)
 - 서비스 지원대상 확대(기준 중위소득 120% → 150%으로 완화)
 - 2019년 아이돌보미 인원수 108명, 실이용 가구수 192가구

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 현재 수영구의 대기자는 0명으로 다른 구에 비하여 적절한 수준의 아이돌보미가 활동하고 있으나 신청자의 대다수가 어린이집·유치원 하원 시간에 이용을 희망하고 있음

○ 개선방향

- ▷ 추후 신청자 증가로 아이돌보미 양성시 신청자가 원하는 시간대에 적합한 돌보미를 선정하여 앞으로도 차질없는 돌봄서비스를 제공하고자 함

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 아이돌봄서비스 수요가 앞으로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 아이돌보미를 2020년엔 20명 추가 채용하여 경력단절 여성의 고용증진에 기여하며 양육자가 원하는 시간에 돌보미를 파견하는 맞춤형 운영으로 돌봄을 확대하여 안심보육에 따른 양육부담 경감에 기여

2-8. 발달장애인 지원 확대

가족행복과 장애인복지계(이동현, 610-4162)

성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 향상과 행동발달을 위하여 소득별 차등 지원을 통하여 높은 발달재활서비스 비용으로 인한 장애아동 양육가족의 경제적 부담경감을 추진함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 이용대상 : 만18세 미만 발달장애아동(지적·자폐성 장애)
- 소득기준 : 전국가구평균소득 180% 이하(소득별 차등 지원)
- 사업내용
 - ▷ 발달재활서비스 지원대상자 확대
 - ▷ 언어·청능, 미술·음악·행동·놀이·심리운동·재활심리, 감각·운동 등 발달재활서비스 제공
- 서비스 제공기관 : 수영구 내 발달재활서비스 제공기관 6개소
- 총사업비 : 1,645백만원(국비 1,151, 시비 494)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,035	724.5	310.5			1,645	1,151	494		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,645	293	293	349	170	175	180	185

□ 세부추진내용

○ 2019년 : 목표 진도율 38%

▷ 신규지원 7명(자폐 2명, 지적 5명) 목표치 달성 (진도율 100%)

□ 문제점 및 개선방향

○ 문제점

▷ 소득기준이 있어 전체 발달장애아동에게 서비스 지원이 어려움

○ 개선방향

▷ 지원가능대상자는 서비스 혜택을 받을 수 있도록 적극 안내

□ 향후계획

○ 적극 홍보를 통한 발달재활서비스 지원대상자 확대

○ 발달장애인 제공기관 확보로 맞춤형 돌봄 강화

▷ 발달재활서비스 제공기관 6개소에서 신규 기관 추가 확보

▷ 발달장애학생 방과후활동서비스 및 주간활동서비스 제공기관 지정
정을 위해 적극 홍보

2-9. 장애인 지원사업 강화

가족행복과 장애인복지계(전은하, 610-4164)

장애인에 대한 각종 재활프로그램 운영 및 상담지원, 사례관리 등을 추진하여 장애인의 복지증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월 ~ 계속
- 사업기관 : 수영구 장애인복지관
- 사업내용 : 장애인의 복지증진을 위한 지원사업 추진
 - ▷ 장애인가족의 양육부담 경감을 위해 보호가 필요한 장애인에게 다양한 활동프로그램 제공
 - ▷ 교육, 직업, 사회재활 및 상담지도 등 지역장애인의 다양한 복지 욕구 충족
- 총사업비 : 160백만원(시비 160)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
160		160			0				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
160				40	40	40	40

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시 및 복지관 운영

○ 2020년 ~ 계속

- ▷ 각종 재활 프로그램 실시 및 장애인가족지원을 위한 복지욕구조사 등 사업 시행

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 수영구 장애인복지관 개관 후 각종 재활프로그램 실시 및 수영구 전체 대상자에게 장애인복지관 홍보 및 수요조사 실시

○ 2020년 장애인 복지욕구 조사

- ▷ 상반기 : 수영구 거주 전 장애인 세대에 복지욕구 조사 및 장애인 복지관 홍보
- ▷ 하반기 : 장애인복지관을 이용하는 장애인 및 가족에 대해 복지욕구조사 실시

2-10. 보건소 치매안심센터 운영

보건행정과 가족보건계(정은경, 610-5640)

치매예방, 상담, 조기진단, 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하여 치매환자와 그 가족 등 구민의 삶의 질 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12월 ~ 2022년
- 사업규모 : 치매안심센터 전용공간 확보(565.18㎡) 및 3개팀 운영
- 사업내용 : 치매안심센터 주요사업
 - ▷ 상담·등록관리 : 치매관련 상담, 환자등록관리, 조호물품 지원 등
 - ▷ 조기검진 및 예방관리 : 조기검진, 치매예방 실천 강화, 고위험군 인지강화
 - ▷ 치매환자쉼터 운영 : 인지재활프로그램 운영, 치매노인공공후견사업
 - ▷ 치매가족 지원 : 돌봄부담분석, 가족교육 및 자조모임, 카페운영
 - ▷ 인식개선 및 교육·홍보 : 치매안심마을 운영, 치매파트너 양성, 지역사회 자원 강화
- 총사업비 : 4,768.3백만원(국비 3,817.7, 시비 475.3, 구비 475.3)
 - ▷ 국비 80%, 시비 10%, 구비 10%

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,768.3	3,817.7	475.3	475.3	-	3,038.3	2,431.7	303.3	303.3	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,173.3	-	1,303.3	870	-	-	-	-

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 치매안심센터 운영 실적
 - ‘19년 치매환자 등록관리/조호물품 제공 : 1,176명/5,360명
 - ‘19년 치매 선별·진단·감별 검사자 수 : 7,324명
 - ‘19년 치매안심센터 프로그램 운영 및 이용자 수
 - 치매예방교실, 쉼터 및 가족교실 등 11개 프로그램 6,426명
 - ‘19년 치매파트너·플러스 양성 : 712명

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 2020년 : 치매안심센터 운영을 통해 치매통합관리 서비스 제공

- ▷ 치매환자 등록관리 및 맞춤형 서비스 연계 확대
- ▷ 지역자원연계 협력을 통한 치매예방활동의 체계화
- ▷ 치매친화적 환경조성을 위한 치매안심마을 운영 확대

○ 2021년~ : 지역사회 치매예방 관리를 위한 컨트롤 타워

- ▷ 체계적인 치매통합관리 서비스 제공
- ▷ 지역사회 연계협력 구축 및 치매친화적 환경 조성



3. 교육 · 보육

- 3-1. 고등학생 무상교복 지원
- 3-2. 수영구 평생학습관 건립
- 3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원
- 3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립
- 3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대
- 3-6. 국·공립 보육시설 증설

3-1. 고등학생 무상교복 지원

창조도시교육추진단 창조교육계(전민영, 610-4126)

관내 거주 고등학교 입학생에 대한 교복구입비 지원으로 학부모 부담 경감 및 교육의 공공성 강화를 통한 교육도시 실현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 지급기준 : 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생
- 대상인원 : 4,882명(※2018. 8월말, 2019 본예산 기준)

구 분	인원(명)	금액(백만원)	비고
계	4,882 (고등학생/부산시 외 중학생 등)	1,465	
2019년	1,322 (1,259 / 63)	397	
2020년	1,285 (1,215 / 70)	386	
2021년	1,174 (1,107 / 67)	352	
2022년	1,101 (1,038 / 63)	330	

※부산시 내 중학교 입학생은 시교육청에서 교복구입비 지원

▷ 고등학교 신입생(2003~2006년생) : 4,619명

▷ 부산시외 중학교 및 학교이외 교육기관 신입생 : 263명

※ 중학교 신입생(2006~2009년생 4,353명)의 약6%

○ 지원액 : 300천원(동·하복 포함)

▷ 부산시교육청 “교복구매운영요령” 교복지원 상한가 305,390원 적용

○ 총사업비 : 1,465백만원(구비)

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.01.13.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계 획 예 산 (총 사업비)					투 입 (확 보) 예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,465			1,465						

연 도 별 사 업 비 집 행 액							
계	기 투자	2018	2019	2020	2021	2022	이 후
1,465			397	386	352	330	

○ 2019년

- ▷ 19. 1. 30. 시행규칙 법제심사 및 조례규칙 심의
- ▷ 19. 2. 1. 부산광역시 수영구 교복지원 조례 시행규칙 제정
- ▷ 19. 2~3월 무상 교복지원 홍보
(현수막게첨, 언론자료배포, 학교 및 공동주택 공문발송)
- ▷ 19. 2. 22. 무상 교복지원 동 담당자 회의 개최
- ▷ 19. 3~4월 교복구입비 지원 집중신청기간 운영
- ▷ 19. 3월12. 15 교복구입비 지원 접수·검토 및 순차적 지급
- ▷ 19. 12월 2019년 3회 추가경정 예산 60,000천원 삭감

□ 문제점 및 개선방안

- 평일 업무시간 중 행정복지센터에 방문하기 힘든 직장인 학부모를 위해 구 홈페이지를 통한 접수도 함께 실시하였으나 다소 까다로운 홈페이지 인증절차, 첨부서류인 재학증명서와 통장사본을 사진촬영 하거나 스캔하여 업로드 해야 하는 절차상의 번거로움, 신청자 개인 컴퓨터 문제에 따른 홈페이지 신청오류 등으로 인한 민원 발생
- ▷ 홈페이지 신청오류로 인한 민원제기 시, 담당자 이메일로 신청할 수 있도록 안내함. 이메일 접수 시 신청자가 접수여부에 대해 확인할 수 없으므로 SMS발송을 통해 접수완료 통보

□ 향후추진계획

- 2020. 01월 교복 지원 세부 추진계획 수립
- 2020. 02월 교복 지원 홍보활동
- 2020. 03월 신청서 접수
- 2020. 상반기 개별 계좌입금

3-2. 수영구 평생학습관 건립

창조도시교육추진단 창조교육계(김명옥, 610-4122)

고령화 시대를 맞아 모든 세대에 맞춤형 평생학습 배움터 운영으로
구민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 평생학습 문화확산 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영로521번길 77
- 사업규모 : 연면적 993.94㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업내용 : 평생학습관 신축
- 협조부서 : 총무과
- 총사업비 : 2,851백만원(☐ 평생학습관 건립 기금)
 - ▷ 설계비 108, 공사비 2,362, 감리비 81, 시설조성 300
- 개 관 : 2019. 7. 9.

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비 (기금)	기타	계	국비	시비	구비 (기금)	기타
2,851			2,851		2,756			2,756	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,756	733	494	1,529				

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2월까지 : 오염토 반출 정화관련 공사 중지
- ▷ 12월 : 토목, 가시설, 기초공사, 평생학습관 철근 배근

○ 2019년

- ▷ 6월 : 준공
- ▷ 6월 : 시설장비 구입 배치, 휴게공간 조성
- ▷ 2019. 7. 9. : 개관

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수영구 스포츠문화타운 내 주차면 부족, 폐쇄형 창호에 따른 환기 어려움 등 이용객 불편사항 접수

○ 개선방안(대책)

- ▷ 부지 내 공영주차장을 건립하여 주차면을 확보(주관: 교통행정과)
- ▷ 폐쇄형 창호 일부를 개폐 가능한 프로젝트 창으로 변경 설치

□ 향후추진계획

- 정규 강좌 및 특강 운영
- 유관부서(기관) 연계 강좌 운영 지원 확대
- 평생학습관 건립 기금 관리 및 제2의 평생학습관 건립 도모

3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원

창조도시교육추진단 창조교육계(권연경, 610-4129)

학생들의 다양한 학습활동 지원과 인근 주민들에 대한 장소 개방으로
지역내 문화·체육활동 공간 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업규모 : 805㎡ (다목적강당, 홀·화장실 등 부대시설)
- 사업내용 : 호암초등학교 다목적 강당 건립 지원
- 주관기관 : 市 교육협력과, 市 교육청, 호암초등학교
- 총사업비 : 3,000백만원 (국비 2,700, 시비 210, 구비 90)
- ▷ 국비 90%, 시비 7%, 구비 3%

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
		○		0%

☐ 문제점 및 대책

- 문제점
 - ▷ 시 교육협력과 「2020년도 학교 다목적강당 건립 지원계획」에 따라 호암초등학교 다목적강당 건립 지원을 신청하려 했으나, 해운대 교육지원청 협의결과 호암초등학교는 2019년 6월 급식실 준공으로 연속지원이 어렵다는 답변을 받음.
- 개선방향
 - ▷ 2020년도 다목적강당 건립은 현재 구조상의 문제로 이용이 불편한 무지개관 4층을 강당으로 이용 중인 민안초등학교로 추진 중
 - ▷ 부산시 다목적강당 추진사업 대상지로 2개 학교 선정이 어려워 호암초등학교의 경우 문화체육관광부 다목적 체육관 공모사업으로 추진

☐ 향후계획

- 국민체육기금 생활체육시설(개방형 다목적 학교체육관) 지원사업 공모 추진(총무과)

3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립

가족행복과 출산보육계(박희영, 610-4323)

육아종합지원센터 건립 공사 완료 후 2019. 6. 1. 개소하여 원활하게 운영 중임

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월
- 사업위치 : 수영구 장대골로 20-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 649.9㎡, 연면적 1,269.7㎡, 지상 4층
- 사업내용 : 수영구 육아종합지원센터 신축 건립

층 별	면적	주 요 용 도
지상1층	249.34㎡	수유실, 놀이실, 시간제보육실, 육아카페
지상2층	340.12㎡	요리실, 프로그램실, 놀이체험실
지상3층	340.12㎡	장난감도서관, 사무실, 상담실
지상4층	340.12㎡	강당, 다목적실

- 협조부서(기관) : 건축과, 재무과
- 총사업비 : 5,513백만원(특별교부세 1,500, 특별교부금 1,500, 구비 2,513)
 ☞ 건축공사비 4,993, 내부시설설치공사 400, 자산취득비 120

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,513			5,513		5,513			5,513	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
5,513	1,612	2,818	1,083				

□ 세부추진내용

- 2019년 : 목표 진도율 100%
- ▷ 2019. 1월 : 내부설치 공사 착공
- ▷ 2019. 4월 : 내부설치 공사 준공
- ▷ 2019. 5월 : 개소 준비
- ▷ 2019. 6월 : 개소 및 운영

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 가정양육 영유아 지원을 위한 장난감 대여, 놀이 체험실 운영,
부모 · 자녀 프로그램 운영, 시간제 보육실 운영에 다양한 콘텐츠
제공으로 양질의 보육환경 제공

3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대

가족행복과 출산보육계(조 건, 610-4321)

임신·출산 친화적인 사회분위기를 조성하고 출산에 따른 경제적 부담을 덜어주기 위하여 다자녀 가정에 대한 출산장려금 지원 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년
- 사업규모 : 2019년 둘째이후자녀 출산장려금 총 356명 지원(2019.12.31.현재)
(둘째자녀 296명, 셋째자녀 51명, 넷째이후 자녀 6명 지원)
- 사업내용 : 둘째 100만원(20만원×5회), 셋째 200만원(40만원×5회),
넷째이후자녀 300만원(50만원×6회)으로 지원 확대
- 총사업비 : 1,967백만원(구비)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			90%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
			1,967			827		827	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,967		108	149	570	570	570	

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019년 9월 : 출산장려금 지원 조례 개정 계획 수립, 입법예고 실시
- ▷ 2019년 9월 : 사회보장협의 요청서(보건복지부) 제출
- ▷ 2019년 10월 : 조례규칙심의회, 조례 개정안 구의회 의결 완료
- ▷ 2019년 11월 : 개정조례 공포
- ▷ 2019년 12월 : 출산장려금 지원확대 예산안 2020 본예산 편성 확정

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 출산율 저하에 따른 사업량(지원 인원 수) 감소
- ▷ 보건복지부 사회보장제도 변경협의 미완료에 따른 지원 금액 조정 가능성 발생

○ 개선방향

- ▷ 출산율 증가를 위한 출산장려시책 발굴·시행
- ▷ 사회보장제도 협의 관련 보건복지부 협조 요청 시 적극 대응

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2020년 ~ : 개정 조례 시행일 이후 출생아 대상 출산장려금 증액 지원

3-6. 국·공립 보육시설 증설

가족행복과 출산보육계(김혜윤, 610-4322)

2022년까지 국공립 보육시설 3개소를 설치할 예정이었으나, 2019년 센텀비스타동원1차 어린이집 등 2개소 3월 개원, 수영SK뷰 어린이집 10월 설치 후 개원 완료하여 100% 공약 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업규모 : 국·공립 어린이집 3개소 설치
- 사업내용 : 국·공립 어린이집 확충
 - ▷ 공동주택 관리동 리모델링 및 민간어린이집 국공립 전환을 통한 국·공립 보육시설 확충
- 협조부서(기관) : 건축과, 재무과
- 총사업비 : 449백만원(국비 180, 시비 90, 구비 179)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
449	180	90	179		449	180	90	179	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
424		-	424	-	-	-	

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 공립 센텀비스타동원1차, 망미이진캐스빌어린이집 2개소 확충

- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 3월

- 세부 추진계획

· 1월 : 공사 착공

· 2월 : 공사 완료 및 개원 준비

· 3월 : 어린이집 개원 ➡ 2019. 3. 1.부터 운영

▷ 공립 수영SK뷰 어린이집 확충

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 10월

- 세부 추진계획

· 9월 : 공사 착공

· 10월 : 공사 완료 및 개원 준비

· 10월 : 어린이집 개원 ➡ 2019. 10. 14.부터 운영

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 2019년 공립어린이집 3개소 확충 완료하였으며, 2019.9월부터 부산
도시공사 기부금으로 민간어린이집 매입하여 공립어린이집으로 1개소
확충 추진중 ➡ '20.3.1.개원 예정



4. 교통 · 안전

- 4-1. 어린이交通安全스쿨존 확대
- 4-2. 방범취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강
- 4-3. 민락매립지 공영주차장 증설
- 4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성
- 4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 4-6. 동별 주거지전용주차장 확대
- 4-7. 미세먼지 제어시스템 확립
- 4-8. 망미지구 우수저류시설 설치
- 4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업
- 4-10. 백산허리길 도로 확대


4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대

교통행정과 교통행정계(김경록, 610-4556)

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업내용 : 어린이 보호구역 확대 및 통합 지정 후 시설물 설치
- 협조부서(기관) : 행정안전부, 부산광역시
- 사업시행절차



- 총사업비 : 800백만원(국비 400, 시비 200, 구비 200)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			75%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
800	400	200	200		680	200	380	100	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
600		400	200	-	-	-	

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2018년 어린이보호구역 개선사업 시행
 - 위 치 : 바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초교
 - 사업개요 : 보호구역 개선 1식
 - 사업기간 : 2018. 6. 15. ~ 2018. 9. 12.
 - 사 업 비 : 400백만원

○ 2019년

- ▷ 2019년 스쿨존 안전환경 정비사업(망미초등학교) 시행
 - 위 치 : 망미초등학교 일원
 - 사업개요 : 보호구역 개선 1식
 - 사업기간 : 2019. 8. 22. ~ 2019. 10. 30.
 - 사 업 비 : 200백만원
- ▷ '19. 09. : 민락초등학교 · 민락초교병설유치원 · 옥련유치원 · 성모유치원
어린이보호구역 확대 지정
- ▷ '19. 10. : 어린이보호구역 개선사업 보조금 확보(80백만원, 시비)

○ 2020년

- ▷ 어린이보호구역 개선사업(민락초등학교)
 - 위 치 : 민락초등학교 일원
 - 사업개요 : 보호구역 개선 1식
 - 사업기간 : 2020. 2. ~ 2020. 4.(예정)
 - 사 업 비 : 80백만원

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 어린이보호구역 개선사업 지속 추진

4-2. 방법 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강

안전관리과 통합관제계(장기수, 610-4492)

민선7기의 구정방향 “구민모두가 행복한 건강안전도시 수명건설” 과 관련, 재난·범죄·생활민원 등 도시문제에 대한 선제적 예방 및 발생시 신속한 대처와 해결을 위한 다목적 CCTV 카메라 설치계획임

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 증설 160대, 보강 300대
- 사업내용
 - ▷ 방법 취약지역, 재난 우려지역 등 CCTV 증설
 - ▷ 사각지대 해소를 위한 기존 회전형 설치장소에 고정형 보강
- 협조부서(기관) : 남부 · 연제경찰서, 해운대교육청
- 총사업비 : 2,034백만원(시비 534, 구비 1,500(특별교부세 1,100))

〈 CCTV 통합현황 : 809대 (2018.7.1.현재) 〉

계	방법용		무단 투기	주차 단속	물출립	그린파킹 (방법)	재난감시	시설관리	학교	
	시	구							초등	중등
809	266	165	79	79	7	11	38	58	73	33

※ 2019.12월 기준 : 총 1,222대, 413대(방법350, 청소15, 주차21, 물출립1, 재난21, 시설2, 초등3) 증가

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			76%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,034		534	1,500		1,578		178	1,400	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,578		633	945				

□ 세부추진내용

○ 2018년 (111대)

- ▷ 구방법 증설(생활안전 CCTV 카메라) : 40대
- ▷ 시방법 증설(CCTV 11단계 사업) : 10대
- ▷ 보강설치 : 61대

○ 2019년 (239대)

- ▷ 방법용 CCTV 구축(4억, 18년특교세) : 증설70대, 보강53
- ▷ 생활안전 CCTV 및 관제센터고도화(5억, 19년특교세) : 증설5대, 보강76
- ▷ 시방법 12단계 구축(45백만원, 시재배정) : 증설15대
- ▷ 민안초등학교 등산로 CCTV설치(5백만원, 구비) : 증설3대
- ▷ 망미 SK뷰 주변 CCTV설치(SK뷰 기부체납) : 증설16대
- ▷ 부경펠리스 앞 고정CCTV 설치 : 증설1대

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 설치지역 인근 주민의 반대로 대상지 발굴 및 설계변경으로 인한 공사지연 발생

○ 개선방향

- ▷ 통장을 통한 건물소유자 및 영업주 사전 동의서를 징수하여 민원 및 공사지연을 사전에 방지

□ 향후추진계획

- 방법용 CCTV 증설 및 보강 지속추진으로 공약사항 이행
- 행정안전부 재난안전 특별교부세 신청 및 예산확보
- 범죄·재해 빅데이터 활용 CCTV 장소 선정 및 시스템 구축

4-3. 민락매립지 공영주차장 증설

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

광안리해수욕장과 민락회센터 일원 방문객 급증으로 인한 교통혼잡, 만성적인 주차난 등으로 인바운드 관광 활성화에 지장을 초래하고 있어 민락매립지 공영주차장을 증설하여 주차난을 획기적으로 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50
- 사업규모 : 대지면적 6,393㎡, 주차전용건물 신축
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면으로 확대)
- 협조부서(기관) : (주)부산크루즈아일랜드, 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 15,050백만원 (민간투자 15,000, 구비 50)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.12.31.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
15,050			50	15,000					

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
15,050				250	4,800	10,000	

☐ 세부추진내용

○ 2020년

- ▷ 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 민자사업계획서 접수 시 검토

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 광안리해수욕장 수상관광호텔 사업계획 승인 시 주차장 증설 후 기부채납 계획되어 있음.
 - 수상관광호텔 : 착공신고(2018. 6.14.), 준공기한(2022. 6.13.)
- ▷ 지하 양수장 시설 이관 시 매립목적 변경에 다른 인가 필요

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 민자사업계획서 접수 시 검토 후 사업 결정

4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

수변어린이 공영주차장 조성으로 민락수변공원 일원 주차난 해소 및 관광 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년
- 사업위치 : 민락동 110-15번지
- 사업규모 : 162면
- 사업내용 : 수변어린이 공영주차장 조성
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 3,900백만원 (국비 1,930, 시 1,970)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,900	1,930	1,970			3,900	1,930	1,970		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,900		3,900					

☐ 세부추진내용

- 2018년
 - ▷ 2018. 10. : 공사 준공
 - ▷ 2018. 11. 16. : 주차장 운영(부산시설공단)

4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

광안리해수욕장 방문객 급증에 따른 만성적인 주차난 해소를 위해
민관협력으로 공영주차장 신축하여 주차문제 해결하여 관광활성화 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 남천2주택재건축정비구역
- 사업규모 : 남천2주택재건축정비구역 내 지하주차장(300대 규모)
- 사업내용 : 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 협조부서(기관) : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비조합
- 총사업비 : 비예산(민간투자사업)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 주택재건축정비사업 조합설립

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진 사항에 따라 공약 이행여부 결정

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2020년 : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축사업 시행 시 주차장 조성 및 기부채납 협의
- 2023년 이후 : 주차면 확보

4-6. 동별 주거지전용주차장 확대

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

주택밀집지역 내 주차난 해소를 위해 주택을 매입하여 주차장 조성하여 주민들의 주차편의 제공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 수영구 관내 주차환경개선지구
- 사업규모 : 주거지전용주차장 10개소 120면
- 사업내용 : 동별 부지매입 주거지전용주차장 확대
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 14,520백만원 (국비 2,900, 시비 1,160, 구비 10,460)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
14,520	2,900	1,160	10,460		7,320	2,900		4,420	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
14,520		1,920	2,163	6,837	1,800	1,800	

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 주차장 준공 및 운영 개시 : 망미1동 457-7번지(18면, 2018.1.1.)

○ 2019년

- ▷ 주차장 준공 및 운영 개시
 - 망미동 441-19번지(7면, 2019.2.22.)
 - 민락동 15-8번지(11면, 2019.5.13.)
 - 수영동 157외 2필지(28면, 2019.8.19.)
- ▷ 주차환경개선지구 내 매입대상 부지 조사 중
 - 광안1동 9블럭, 망미2동 3블럭 · 4블럭, 수영동 2블럭 · 4블럭
- ▷ 부지 매입 완료 및 공사 사전 절차 이행
 - 망미동 937-90, 광안동 129-28,29

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 부동산 가격 상승에 따라 동별 주차장 확보에 필요한 부지확보 어려움 예상

○ 개선방향

- ▷ 일반회계 예산을 추가 확보하여 부지매입비 확보 검토

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 주차환경개선지구 내 부지 매입 : 2개소
- 호암골 노외공영주차장 조성
 - ▷ 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료
 - ▷ 2020. 6. : 공사 착공
 - ▷ 2020.12. : 공사 준공
 - ▷ 2020.12. : 위탁운영계획수립 관리위탁(입찰)

4-7. 미세먼지 제어시스템 확립

환경위생과 환경지도계(김태익, 610-4394)

최근 고농도 미세먼지로 국민의 건강위해와 불편이 증가함에 따라 미세먼지 제어시스템을 확립하여 맑고 쾌적한 대기환경을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
 - ▷ 미세먼지 저감·회피시설, 쿨링포그 시스템 확충(시·구 시범사업)
 - ▷ 미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 추진(대형공사장)
 - ▷ 도로 먼지 흡입 및 살수 차량 수시 운영(구, 부산환경공단)
 - ▷ 비산먼지 공사장 점검, 운행자동차 점검 강화(공사장, 경유차)
 - ▷ 공공시설, 취약계층 실내공기질(미세먼지) 무료측정 상설 운영
 - ▷ 미세먼지 정보 표출 다양화와 신속한 정보 제공(시, 구민)
 - ▷ 미세먼지 예·경보 발령 시 비상대책본부 가동(공사중단, 차량제한)
 - ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진(시·구)
- 협조부서 : 가족행복과, 자원순환과, 일자리경제과, 안전관리과, 건축과, 건설과, 동 행정복지센터 등
- 총사업비 : 1,270백만원

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,270	448	413	409		534	151	231	152	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,270			534	736			

※ 미세먼지 대응 국비보조사업 추가(변경) 등으로 변동될 수 있음

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 미세먼지 관련 공사관계자 간담회 개최('19.2.20, 대형공사장 16개소)
 - ▷ 미세먼지 관계부서 대책회의 개최('19.2.25, 부구청장 주재, 11개 부서장)

- ▷ 미세먼지 대응 추진상황 보고회 개최('19.11.19, 부구청장 주재, 12개 부서장)
- ▷ 미세먼지 회피시설 1개소 설치('19.5월, 수변어린이공원 벽면녹화)
- ▷ 실내공기정화식물 시범보급('19.5월, 구청·동주민센터 민원실 등)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원(40대)
- ▷ 고농도 미세먼지 대응 민간 살수차 임차(3일, 6대)
- ▷ 취약계층 실내공기질(미세먼지) 무료측정 개소
- ▷ 비산먼지발생사업장 지도·점검 실시 130개소
- ▷ 운행차 배출가스 단속 등 실사(기기점검 79대, 무료점검 298대, 육안감시 2010대 등)
- ▷ 관련부서 미세먼지 대응업무 추진(저소득층 마스크 보급, 취약계층 공기청정기 지원, 미세먼지 저감 조림사업, 구청 발주공사 친환경 건설기계 사용 권고 등)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ “미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 시범사업” 추진을 위해서는 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제24조에 의거 미세먼지 측정기기 성능인증제(시행 2019.08.15.) 도입 후 단가에 따른 예산 확보 필요

○ 개선방향

- ▷ 미세먼지 측정기기 성능인증제 도입 후 2020년 “대형공사장 미세먼지 간이측정기 시범설치 및 모니터링” 사업 추진

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 시스템 시범적 1개소 설치
- ▷ 미세먼지 발생원인 대형공사장(토목공정) 위주 모니터링 시스템 설치 (20,240천원)
- 소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원
 - ▷ 소규모 사업장(중소기업)의 대기방지시설 및 사물인터넷(IoT) 계측기 설치비 지원(135,000천원)
- 미세먼지 저감 종합 대책 과제별 업무추진 및 부서별 추진사업 이행 여부 관리
- 미세먼지 대응 국비보조사업(가정용 저녹스보일러 설치지원, 소규모 사업장 방지시설 설치지원 등) 지속 발굴 및 추진

4-8. 망미지구 우수저류시설 설치

건설과 토목계(장석형, 610-4692)

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 망미동 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하여 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업규모 : 우수저류시설 V=26,800m³, 게이트펌프 1개소 등
- 사업내용 : 우수저류시설 설치
- 총사업비 : 22,400백만원 (국비 11,200, 시비 11,200)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
22,400	11,200	11,200			12,224	10,724	1,500		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
22,400	1,000	11,224	476	9,700			

☐ 세부추진내용

- 2019년

- ▷ 2019. 01. : 대체부지(수영동 553, 경관녹지) 검토
- ▷ 2019. 05. 02. : 경관녹지 주민설명회 개최(수영동 주민복지센터)
 - 주민들의 반대로 주민설명회 무산

- ▷ 2019. 05. 15. : 구청장과 주민들과의 대화 개최
 - 경관녹지 사업시행 결사반대
- ▷ 2019. 05. 22. : 국회의원, 구의원-주민들과의 현장간담회
 - 주거지와 접한 우수저류사업 예정지는 부적정
- ▷ 2019. 06. 26. : 망미지구 우수저류시설사업 조치계획 검토
- ▷ 2019. 07. 03. : 사업취소 요청
- ▷ 2019. 09. 15 : 우수저류시설 설치사업(수영 망미) 취소 통보
- ▷ 2019. 12. : 우수저류시설 대체 방안 모색
- 2021년 : 자연재해위험개선지구 지정
- 2022년 이후 : 자연재해위험개선지구 정비공사 시행

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 당초 사업대상지인 망미초교 및 그 외 대체부지들에 대하여 주민설명회 등 사업타당성 검토 및 사업시행을 추진하였으나
- ▷ 학부모들 및 지역 주민들의 우수저류시설 설치 반대 등으로 유역내 적정한 사업부지 확보 난항

○ 개선방향

- ▷ 우수저류시설은 향후 일대의 주택재개발정비사업 등 대단위 사업 시행시 사전재해영향성검토를 통해 사업부지내 설치 추진
- ▷ 침수 지역은 자연재해위험개선지구로 지정, 정비사업 추진

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2021년 : 자연재해위험개선지구 지정
- 2022년 이후 : 자연재해위험개선지구 정비공사 시행

4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감사업

건설과 하수계(조민준, 610-4942)

강우시 육상 비점오염물의 해양 유출로 해양수질이 악화되고 있어 비점오염저감시설을 설치하여 광안리해수욕장 수질 개선과 해수욕장을 찾는 관광객에게 쾌적한 해양환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 민락동 광안근린공원 내(하수중계펌프장 인접)
- 사업규모 : 비점오염저감시설 설치 V=3,300m³
- 총사업비 : 8,251백만원(공사 7,309, 감리 571, 설계 371)
 - 공 사 비 : 5,837백만원(도급 3,632, 관급 2,152, 폐기물 53)
 - ※ 전기공사(469백만원) 별도 분리발주

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,251	4,125.5	4,125.5			7,910	3,955	3,955		

연도별 사업비 투자액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
8,251	348	3,194	4,368	341	-	-	-

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 3월 : 도시관리계획 결정 및 지형도면고시
- ▷ 2019. 4월 : 공사 및 건설사업 관리용역 계약심사
- ▷ 2019. 6월 : 공사 착공 및 공사 일시정지(6.26.)
 - 정지사유 : 해수욕장 개장기간 민원발생 우려 등('19. 7~8.)
- ▷ 2019. 9월 : 공사 재개
- ▷ 2019. 12월 : 공사 추진 중

□ 향후추진계획

- 2020. 1월 : 부단수 차단 및 압송관로 이설
- 2020. 2월 : 가시설 설치
- 2021. 2월 : 공사 준공

4-10. 백산허리길 도로 확대

건설과 토목계(장석형, 610-4692)

민락동 수변공원, 광안리해수욕장 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로 교통 환경을 제공함에 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년까지
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 선형개량 등 위험도로구조개선 L=700m
- 총사업비 : 10,000백만원 (국비 5,000, 시비 5,000)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,000	5,000	5,000			5,400	2,700	2,700		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
10,000	1,450	1,200	2,750	2,100	2,500		

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 19.10월 : 토지1필지 수용재결신청
 - ▷ 19.12월 : (보완)설계용역 발주

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 당초 실시설계 결과(공사비 100억)는 예산이 과다하게 소요되어 계획대로 도로개설이 어려운 실정임.

○ 개선방향

- ▷ 총사업비 변경 불가에 따라, 당초 총사업비(100억)에서 보상비, 설계비 등을 제외한 가용 공사비(43억)내에서 현황도로 활용, 차로수 축소(4차로→2~3차로), 종단경사 조정, 편측 보도설치 등 절·성토 및 구조물 계획을 최소화한 보완설계를 시행하여 사업 마무리

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2020년 : 보상완료, 공사착공
- 2021년 : 공사준공



5. 생활 · 경제

- 5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거
- 5-2. 반려견 놀이공원 조성
- 5-3. 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성
- 5-4. 수영구 국민체육센터 건립
- 5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화
- 5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화
- 5-7. 재건축·재개발 적극 추진

5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거

건설과 토목계(장석형, 610-4692)

남천동 남천해변시장 일원 상권활성화를 위한 육교철거에 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 육교철거 (L=29.8m, B=3.0m, H=4.5m)
- 총사업비 : 100백만원 (시비)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
100		100							

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
100						100	

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 장기검토 대상으로 2019년 추진실적 해당사항 없음

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 수반되며 지방경찰청 소관사항임
 - 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 우려로 난색 표명

○ 개선방향

- ▷ 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치 아파트) 추진 시 육교
철거 및 횡단보도 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적으로 검토

□ **향후추진계획(예산확보 등 추진방향)**

- 2021년 : 횡단보도 신설 및 육교철거 가능여부 검토
 - ▷ 대연4동 주택재건축사업으로 인한 지역여건 변화등을 고려하여
남구청, 부산지방경찰청과 업무 협의
- 2022년 : 육교철거

5-2. 반려견 놀이공원 조성

일자리경제과 농수산계(허은진, 610-4507)

반려동물의 복지증진 및 사람과 동물이 함께하는 사회문화 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 관내(미정)
- 사업규모 : 반려견 놀이공원 조성 1개소
- 사업내용 : 펜스시설, 반려견 놀이기구, 음수대, 운영관련 인건비 등
- 총사업비 : 300백만원(시비 100, 구비 200) ※부지 확보비 제외

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
300		100	200						

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 대상 부지 확정

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 부지확보

- 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견 놀이터를 조성할 수 있으나 우리 구의 경우 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 규모의 공원으로 공원 내 조성은 불가

▷ 민원발생 가능

- 주택지 인근에 조성 할 경우 반려견 놀이시설에 대한 부정적인 인식 때문에 주민들의 반대가 심할 것으로 예상됨

○ 개선방향

▷ 부지확보

- 공유지를 활용, 토지 매입비용(전액 구비-약 1억 원 ※ 공시지가 10만원/1㎡기준) 확보가 필요하며 규모는 최소 1,000㎡이상
※ 소규모로 조성 할 경우 사업 효과를 기대하기 어려움

▷ 민원발생

- 부지 확정 전 설문조사, 공청회 등을 통해 충분한 주민의견 수렴 시행
※ 경기도 의왕시, 부산시 해운대구 등 - 주민반대로 사업 중단

☐ **향후추진계획(예산확보 등 추진방향)**

- 부지 선정 후 시설 관련 예산 확보 추진

5-3. 수영고가도로 하부 B-con 그라운드 조성

창조도시교육추진단 창조사업계(이근표, 610-4891)

수영고가도로 하부 유휴공간을 컨테이너형 복합생활문화공간으로 조성하여, 기존 좌수영성 및 F1963등 주변 자원과 연계하여 관광자원화 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업위치 : 수영구 망미동 601-1번지 일원(수영고가교 하부)
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,997.08㎡, 철골구조 가설건축물
- 사업내용 : 수영고가교 하부 컨테이너형 복합생활문화공간 조성
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019. 12. 31.현재
	○			95%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
9,000	4,500	4,500			9,000	4,500	4,500		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
9,000	400	4,600	1,910	2,080			

☐ 세부추진내용

- 2020년
 - ▷ 2차분 공사 준공(2020. 2. 28.예정)
 - 2차분 : 커뮤니티그라운드, 패밀리테크, 모바일스테이지, 아트갤러리

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2차 공사 준공(2020. 2. 28.예정)

5-4. 수영구 국민체육센터 건립

총무과 생활체육계(마가형, 610-4931)

지난 50여년간 채석장, 구)공무원교육원으로 인해 상대적으로 낙후되었던 지역에 생활체육 수요를 충족시키는 체육시설을 설치함으로써 지역발전과 구민 체력증진을 도모할 수 있는 틀을 다짐

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(舊 . 공무원교육원 부지)
- 사업규모 : 대지 9,913㎡, 연면적 6,986㎡
- 사업내용 : 수영구 국민체육센터 건립
- 협조(감독)부서 : 재무과, 일자리경제과, 건축과, 교통행정과
- 총사업비 : 24,185백만원(국비 3,200, 시비 7,100, 구비 13,885)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019. 6. 30. 기준
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
24,185	3,200	7,100	13,885		24,185	3,200	7,100	13,885	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
24,185	7,590	6,227	10,368				

□ 세부추진내용

- 2015. 01 : 구)공무원교육원 부지 매입 추진계획 수립
- 2015. 12 : 구)공무원교육원 부지 일원 공유재산 매매계약 체결
- 2016. 03 : 설계용역 현상 공모 공고(5월 용역 착수)

- 2017. 01 : 설계용역 완료
- 2017. 04 : 수영구 스포츠문화타운 기공식 개최
- 2017. 07 : 오염토 발생에 따른 정밀조사 및 정화작업('18.4.19완료)
- 2019. 06 : 준공
- 2019. 07 : 운영 개시

□ 향후계획

- 국민체육센터 위탁 운영 관리 집중
 - ▷ 정기 및 수시 지도 점검으로 운영 효율성 점검
 - ▷ 매월 시설적립금 납부 및 운영 현황 보고 확인
- 지속적인 하자보수 및 시설점검
 - ▷ 시공사 및 관계사에 하자보수 요청 및 진행
 - ▷ 공사 감독관 및 외부전문가를 통한 시설 점검 실시
- 국민체육센터 이용객 만족도 제고
 - ▷ 연1회 이상 이용객 만족도 조사를 통한 건의사항 반영
 - ▷ 분기별 직원 친절 교육을 통한 친절도 향상
 - ▷ 이용객 실시간 감면 조회 서비스를 통한 이용료 감면 간편화

5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화

일자리경제과 일자리창출계(윤희림, 610-4821)

일자리종합센터 개소(2019. 3. 22.)하여 전문인력 운용 및 프로그램 다양화로 보다 종합적이고 전문적인 취·창업서비스를 제공함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 계속
- 사업위치 : 수영구청 1층 일자리 종합센터
- 사업내용
 - ▷ 취업지원 서비스 강화
 - 직업상담 및 구인등록·알선
 - 구인구직 만남의 날, 찾아가는 취업지원 상담소, 채용박람회
 - 구직자·구인업체 발굴
 - ▷ 창업지원 서비스 제공 및 활성화
 - 창업초기상담, 창업지원제도 정보제공 및 안내, 창업가이드북 제작배부
 - 창업관련 설명회 개최, 컨설턴트 연계 및 창업가 네트워킹 지원
 - 청년창업등지 및 창업육성센터 운영 지원
- 총사업비 : 670백만원 (시비 65, 구비 605)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
670		65	605		221		55	166	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이전
598		107	104	104	105	115	125

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 2019. 3. 22. 일자리종합센터 개소

- 취업상담사(4명), 창업상담사(1명), 구인구직개척단(2명) 근무
- 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진

(‘19. 12. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2019년 추진 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
544	4,331	12,190	3,895	769	206

- ▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(9회), 찾아가는 취업지원 상담소(4회), 동부산권 채용박람회 개최(4월, 4,000여명 참가), 동행면접(23회), 수영구 채용박람회(9월, 1,300여명 참가), 호텔객실관리사 양성교육(6회, 96명 참여, 81명수료)
- ▷ 창업설명회 개최 : 마케팅전략 창업설명회(4월), 카페창업설명회(5월) 성공창업가 초청 창업특강 2회(10,11월)
- ▷ 창업가이드 북 개정판 제작 및 배부
- ▷ 청년창업동지 16팀, 창업육성센터 4팀 입주

□ 문제점 및 대책

○ 문제점(미흡한 점)

- ▷ 구민 홍보 부족

○ 개선방향

- ▷ 각종 온·오프라인 홍보 매체 활용 일자리종합센터 홍보 강화
 - 일자리종합센터 홈페이지 오픈(2019.12.)으로 채용정보 및 취·창업 프로그램 안내 및 홍보로 이용률 제고

□ 향후계획

○ 일자리종합센터와 연계한 일자리창출 교육훈련 사업추진

- 구인구직 미스매치 해소를 위한 실무위주의 교육과 일자리창출
- 지역산업맞춤형일자리 창출사업(2020. 2.~ 12.), 경비원양성 사업(2020. 2. ~ 9) 등, 교육훈련 후 일자리종합센터에서 취업알선까지 원스톱 취업지원서비스 제공
- 창업설명회, 창업네트워킹 지원 등을 통해 창업지원 뿐만아니라 고용연계까지 지원

5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화

일자리경제과 일자리창출계(김혜연, 610-4825)

2018년 ~ 2019년에 예비 사회적기업 5개, 마을기업 1개를 신규 발굴하여 공약사항(신규기업 발굴)을 기 달성하였으며, 2019년에 사회적경제협의회 구성을 위한 기업대표 간담회를 실시하여 사회적경제 네트워크 구축을 위한 초석을 다지는 등 사회적경제 활성화에 최선을 다함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 12월
- 사업규모 : 사회적기업 21개소·마을기업 6개소('19년 12월말 기준)

〈 기업현황 〉

- 사회적기업 - 미디토리 협동조합, (주)문화공, 열린문화공동체 딱, (주)플레이 더 부산, (주)다름, (주)미스터박대리, (주)새늘투어, (주)우리동네서원, (주)공연전문점알, (주)뿌리마케팅, (주)에코펠프, (주)푸치토야, (주)블루밍청춘, (주)쿼터, (주)브이리지, 야구메이트협동조합, (주)NMD엔터테인먼트, (주)아이그램, (주)픽쳐스온, (주)티을, (주)틴커스페이스
- 마을기업 - 길손공동체, 천연애, (주)오랜지바다, 에코창작센터, (주)푸조와 곰솔, 리크로스

○ 사업내용

- ▷ 사회적기업, 마을기업 신규 발굴 : 4년 간 5개 기업 신규 발굴
- ▷ 사회적기업 및 마을기업 네트워크 구축 : 「사회적경제협의회」 구성
- ▷ 기업 인지도 제고 및 판로개척 등을 위한 다양한 특화사업 추진

○ 총사업비 : 4,435백만원 (국비 3,213, 시비 1,141, 구비 81)

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			55%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,435	3,213	1,141	81		1,342	933	375	34	

연도별 투자계획							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4,435	-	733	733	739	739	743	748

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 사회적기업 1개 신규 발굴, 마을기업 1개 신규 발굴
- ▷ 제1회 사회적경제기업 주간행사 신설 및 개최

○ 2019년

- ▷ 사회적기업 4개 신규 발굴, 청년일자리사업 14명 지원
- ▷ 사회적경제기업 간담회 개최 ▷ 2회
- ▷ 제2회 사회적경제기업 주간행사 개최 ▷ 1회

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 사회적경제협의회 구성 및 운영 어려움
 - 각 개별 기업의 스케줄에 따른 민간 참여 어려움
 - 관 주도 협의회 구성 시 형식적으로 고착될 우려

○ 개선방향

- ▷ 정기적인 간담회를 통한 민간 참여 독려
 - 사회적경제 간담회를 정례화하여 민간 주도로 협의회를 구성하도록 유도

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 제3회 사회적경제 주간행사 개최

- ▷ 개최시기 : 2020. 9월 예정
- ▷ 행사장소 : 광안래해수욕장 테마거리

○ 사회적경제협의회 구성 및 운영

- ▷ 사회적경제 간담회 정례화 : 분기 1회 개최
- ▷ 사회적경제협의회 구성 : 2020년 연내

5-7. 재건축·재개발 적극 추진

건축과 재개발계(안해성, 변상천 610-4662, 4661)

2022년 내 준공 및 사업완료 가능한 사업장에 대하여 적극 행정지원을 통해 추진가속화 진행하고 있음

☐ 사업개요

○ 대상구역

- ▷ 재건축 : 남천2재건축(삼익빌라, 타워, 비치), 광안1재건축, 광안2재건축
- ▷ 재개발 : 남천2재개발, 망미1재개발, 망미2재개발, 광안2재개발

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.12.31.현재
	○			35%

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 관리처분계획인가 1건(광안2재개발)
- ▷ 착공 1건(남천2재개발)
- ▷ 준공 2건(남천2재건축(삼익빌라), 망미2재개발)

☐ 향후추진계획

○ 행정지원

- ▷ 공약사항 대상 사업은 민간 조합에서 시행하므로, 우리 구에서 계획 등의 조정은 불가하나, 2022년 내 준공 및 사업완료 가능한 사업장은 원활히 사업 추진이 되도록 적극적 행정지원을 하고자 함

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.
