

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

우리 수영구에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
광안3동 복합동사 건립	3,608	1,401	2,207	-	-	2023	2020	100
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	3,660	289	3,371	-	-	2023	2020	100
노니는 유(遊)	96	0	96	-	-	2023	2022	100
한국지역도서전 유치 및 개최	50	0	50	-	-	2023	2022	100
수영구 복지하나로 센터 건립	18,071	2,814	-	1,546	13,711	2029	2020	15
민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	13,000	22	300	7,678	5,000	2025	2021	20
망미중학교 다목적강당 건립 지원	5,005	-	-	5,005	-	2024	2021	35
광안리4지구 연안정비 사업	4,440	310	1,376	2,754	-	2024	2021	33
수영동 행정복지센터 재건립	5,545	-	10	248	5,287	2027	2022	5
광안리 M 드론라이트쇼	7,126	1,520	1,837	1,741	2,028	매년추진	2022	해당없음
광안리 어방축제	4,818	1,053	1,075	1,345	1,345	매년추진	2022	해당없음
청년과 함께하는 커뮤니티 복합공간 [광:안뜰] 조성사업	4,950	1,750	179.3	3,020.7	-	2024	2022	10
광안리 발코니 음악회 운영	360	-	120	120	120	매년추진	2022	해당없음
카운트다운 부산	580	280	100	100	100	매년추진	2023	해당없음
APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN	2,470	1,000	700	770	-	매년추진	2023	해당없음

개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	광안3동 복합동사 건립	담당자	행정지원과 남지윤(3610-4112)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적

○ 노후된 광안3동사(1981년 건립)는 대지면적과 건축면적이 협소하여 증·개축을 통한 공간활용이 어려움으로 대체부지에 신축 필요

○ 공공건축물의 다변화 기능을 반영하기 위해 복합동사 건립하여 지역주민 숙원사업 해결 및 미래 행정수요 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9월 ~ 2023. 4월

○ 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1069-11

○ 규 모 : 대지 403.4㎡, 연면적 998.22㎡, 지하1층 지상4층

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	3,608	0	0	28	804	569	2,207
국 비	0						
시 비	0						
구 비	3,608	0	0	28	804	569	2,207
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진내역

○ 2019. 9월 : 광안3동 복합동사 건립 기본계획 수립

○ 2019. 11월 : 공유재산 심의 및 공유재산 관리계획 의회 의결
(회계이관, 건물취득), 중기재정계획 반영

○ 2020. 4월 : 부산시 투자심사(적정), 공공건축 사업계획 사전 검토


○ 2020. 5월 : 공공건축심의(수영구 건축위원회)

- 2020. 9~11월 : 건축설계공모(일반 설계공모) 진행
- 2021. 1~9월 : 기본·실시설계용역 실시 및 준공
- 2021. 10~12월 : 공사 입찰 및 계약 체결
- 2022. 1월~2023. 4월 : 공사 실시 및 준공

□ 완공 사진



광안3동 행정복지센터 외관

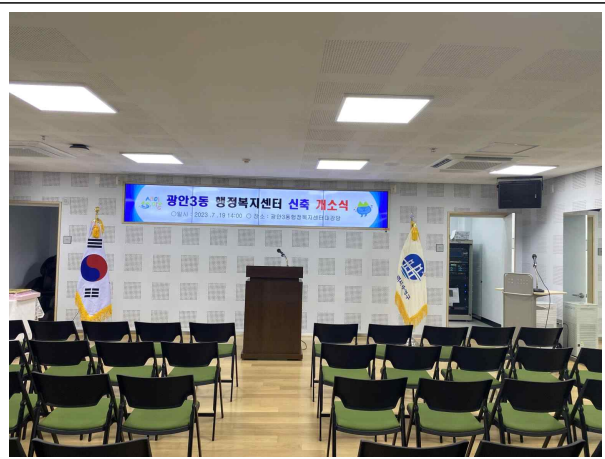

지하1층 대강당



지상2층 행정민원실



4층 주민커뮤니티실

사업명	수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	담당자	행정지원과 김수연(☎610-4795)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적

- 수영구 스포츠문화타운이 2019년 7월부터 개관하여 운영 중이나, 기존 지하주차장이 협소하여 대기차량이 발생하고 불법 주·정차로 인한 교통 장애가 유발되어, 부설주차장 추가 건립을 통해 이용자 및 인근 거주 주민의 불편과 안전사고 발생 우려를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 9월 ~ 2023년 12월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77 (광안동 1333)
- 규 모 : 건축면적 921.75㎡, 연면적 2,741.52㎡ (3층4단 철골조, 99면)

□ 투자심사 결과 : 적정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	3,660	0	0	0	159	130	3,371
국 비	0						
시 비	0						
구 비	3,660	0	0	0	159	130	3,371
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진내역

- 2019. 11. 2020 ~ 2024년 수영구 중기지방재정계획 반영
- 2020. 9. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 기본계획 수립
- 2020. 10. 2020년 제5차 수영구 공유재산심의회 원안 가결
- 2020. 11. 2020년 수시 재정투자사업 심사 원안 승인
- 2020. 12. 2021년도 정기분 부산광역시 수영구 공유재산 관리계획안 원안 가결
- 2021. 4. 부산시 공공건축 사업계획 사전검토 결과 통보
- 2021. 5. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 사업계획 변경(건축과)

- 2021. 7. 공공건축심의(區 건축위원회)
- 2021. 7. 계약심사(부산시) 이행 ▷ 심사금액 145,684천원
- 2021. 8. 건축 설계 공모 진행
- 2021. 10. 설계공모 당선작 선정
- 2021. 11. 기본·실시 설계용역 계약 및 착수
- 2022. 2. 지반조사 및 기초보강 용역으로 인한 설계 일시 정지
- 2022. 4. 실시설계 중간보고회, 용역 기간 연장
- 2022. 8. 실시설계 최종보고회
- 2022. 11. 실시설계용역 완료
- 2022. 12. 스포츠문화타운 부설주차장 건립공사 계약체결
- 2022. 12. 공사 착공
- 2023. 11. 공사 준공
- 2023. 12. 스포츠문화타운 부설주차장 운영

사업명	노니는 遊(유)	담당자	문화관광과 이우철(0610-4512)
-----	----------	-----	----------------------

□ 사업목적

- 지역 고유의 특징과 역사전통을 바탕으로 지역 콘텐츠 제작 및 발표를 지원하여 지역 자원의 활용 증진과 활성화
- 지역 문화 관련 창작 생태계를 형성하고, 다양한 지역 콘텐츠를 통해 문화 도시 브랜드 형성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 입찰을 통한 총괄운영단체 선정 후 계약 체결
 - 콘텐츠 공모 운영 및 축제형식의 경연 행사 진행
 - 우수 콘텐츠 선정 및 지원
 - 우수 콘텐츠 상설 공연 진행(1개 공연 최소 3회 이상)
 - 우수 콘텐츠 운영 결과 및 성과공유회 개최

□ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획에 반영하는 조건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 96백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	96	0	0	0	0	0	96
국 비	0						
시 비	0						
구 비	96	0	0	0	0	0	96
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진내역

- 2023. 4.~10. 노니는 유(遊) 시민기획단 ‘얼쭈영’ 운영
 - 시민기획단 모집 공고(4.13.~5.2.), 최종선정(5.3.)
 - 오리엔테이션 및 교육(5.9.)
 - 월1회 마당극·마당놀이 모니터링, 전통·지역콘텐츠 분석 및 리뷰
 - 결과공유회 진행(10. 24.)
- 2023. 5.~10. 노니는유- 수영사적공원 상설 마당놀이 공연(5월, 짝수달 4회)
- 2023. 5.~11. 노니는유- 수영사적공원 상설 마당놀이 공연(홀수달 4회)

□ 사업변경 내역

- 입찰을 통해 총괄운영단체 선정하지 않고 매월 주관 공연단체 선정하여 위탁 용역함

사업명	한국지역도서전 유치 및 개최	담당자	문화관광과 이우철(☎610-4512)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적

- 한국지역출판연대를 비롯해 우리 구 포함 전국의 출판인과 지역주민이 참여하는 페스티벌, 전시행사 등 개최를 통해 아시아 문화중심도시 수영구로 나아가기 위한 기반 마련과 도서 문화 저변 확대를 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 한국지역도서전 개최를 위한 기본계획 수립
 - 한국지역도서전 조직위원회 구성(2023. 3. ~ 4.)
 - 수영구 한국지역도서전 세부실무계획 수립 및 세미나 개최
 - 수영구 한국지역도서전 개최를 위한 홍보
 - 제7회 한국지역도서전 개최(2023. 9. ~ 10. 중)

□ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획에 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	50	0	0	0	0	0	50
국 비	0						
시 비	0						
구 비	50	0	0	0	0	0	50
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진내역

- 2023. 2. 한국지역도서전 기본계획 수립
- 2023. 6. 한국지역도서전 조직위원회 구성
- 2023. 7. 한국지역도서전 조직위원회 출범식
- 2023. 7.~9. 한국지역도서전 홍보 및 개최 준비 및 사무국 운영
- 2023. 10. 제7회 한국지역도서전 개최

※우천으로 개최일자 변경: (기존)2023. 9. 15.~9. 17. → (변경) 2023. 10. 20.~10. 22.

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	수영구 복지 하나로 센터	담당자	재무과 신동근(☎610-4152)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 구청사 과밀화로 인한 공간 부족 일부 해소 및 증가하는 복지수요 대비
- 복지업무 원스톱서비스 제공 및 지역 불균형 해소를 위한 드림스타트센터 추가 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2029년(8년)
- 위 치 : 수영구 광안동 735-4번지
- 규 모 : 대지 915.5㎡, 연면적 4,104.04㎡(부지매입 27.75억원, 2021년 6월)

☐ 투자심사 결과 : 조건부 승인

- 중기(지방)재정계획 반영(수정) 및 예산편성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,071백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	18,071	0	2,775	39	0	1,546	13,711
국 비	0						
시 비	0						
구 비	18,071	0	2,775	39	0	1,546	13,711
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 15%)

- 2020.04. 구청사별관 복지하나로센터(가칭) 건립 기본계획 수립(기획감사실)
- 2020.04. 광안동 735-4번지 부지 매입 협조 요청 市
- 2020.10. 지방재정투자사업 심사(市)
- 2020.12. 2021년 공유재산관리계획 승인(區)
- 2021.06. 부지 매입
- 2021.11. 복지하나로센터(가칭) 건립계획 수립▷재무과
- 2022.03. 건축기획용역 발주

- 2022.04. 부산시'15분 생활권'조성 정책공모 신청⇨공모탈락('22.06)
- 2022.06. 건축기획용역 일시중지 : 총 사업비 및 건립공간 재검토 필요
- 2022.07. 건립 관련 TF팀 회의 및 총 사업비 조정 검토보고
- 2022.09. 건축기획용역 완료
- 2022.09. 2030부산도시관리계획 재정비 용역반영 요청(2종⇒3종)

□ 향후계획

- 2025. 건립계획 수립 ※ 2030부산도시관리계획 재정비 용역 결과('24 하반기) 사업규모 확정
- 2025. 공공건축 사업계획 사전검토(市 공공건축지원센터)
- 2025. 공유재산심의회
- 2025. 공유재산관리계획 변경 의회승인(區)
- 2025. 공공건축심의(市 공공건축심의위원회), 월1회
- 2025. 실시설계공모(3개월)
- 2026. 기본.실시설계용역(12개월)
- 2027. 지방재정투자 재심사(市, 3개월) ⇨ 실시설계완료 후 재심사
- 2027. ~ 2029 상반기. 공사발주·준공

사업명	민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	담당자	교통행정과 장현석(☎610-4552)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 광안리 일대 지구단위계획 변경 이후 해안가 소규모 주거시설 급증에 따른 관광지 일원 주차 및 교통난 악화
- 국내 대표 관광지인 민락수변공원 및 민락회타운 단체관광객을 위한 대규모 버스전용 주차장 및 인근 환경정비를 위한 주차공간 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2025년
- 위 치 : 부산광역시 수영구 민락동 113-46, 113-50번지
- 규 모 : 부지 6,393㎡, 연면적 8,540.02㎡ 철골조 2층 3단(주차면수 320면)

□ 투자심사 결과 : 조건부 승인

< 조건부 내용 >

- 국비(균특회계) 확보 후 추진
- 인근 공영주차장 가동률, 회전율 및 인근지역 불법 주차율 등 주차실태를 파악하여 적정 주차 면수 고려
- 공사 기간 내 교통대책, 안전관리대책 방안 마련 필요
- 인근 주거지 민원(조망권, 소음, 교통난 등) 우려, 사업추진 전 주민설명회 및 공청회를 통한 의견 수렴 필요
- 중기지방재정계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	13,000	0	0	22	300	7,678	5,000
국 비	200	0	0	22	0	178	0
시 비	7,620	0	0	0	0	5,400	2,220
구 비	5,180	0	0	0	300	2,100	2,780
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 20%)

- '21. 7. : 추진계획 수립
- '21. 10. : 지방재정투자사업 심사(조건부 승인)
- '21. 11. : 2022~2026 중기지방재정계획 반영, 공유재산관리계획 변경
- '22. 2. : 기본계획 수립
- '22. 5.~8. : 건축기획설계 용역 추진
- '22. 7. : 주민설명회 개최(1차)
- '22. 11. : 부산시 공공건축 심의위원회 심의(조건부 승인)
- '22. 12. : 부산시 용역계약심사 완료
- '23. 4. : 기본 및 실시설계용역 실시
- '23. 9. : 주민설명회 개최(2차)
- '23. 9. : 공유재산심의(원안가결)
- '23. 11. : 2024~2028 중기지방재정계획 반영
- '23. 11. : 경관심의(조건부 의결), 건설기술심의(조건부 승인)
- '23. 12. : 지방재정투자사업 재심사 의뢰

□ 향후계획

- '24. 1.~2. : 설계 경제성 검토(VE) 시행
- '24. 2. : 기본 및 실시설계용역 완료
- '24. 3. : 공사계약심사(부산시), 공사원가 사전심의(조달청)
- '24. 6.~25. 9. : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

- 지방재정투자사업 재심사결과에 따라 향후 사업비 변경 예정
 - 사업비 : 80억원 → 130억원

사업명	망미중학교 다목적강당 건립지원	담당자	평생교육과 원명재(☎610-3935)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여
- 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 5월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 망미배산로 102
- 규 모 : 연면적 1,040㎡
 - 지상 1층 : 주차장(피로티)
 - 지상 2층 : 다목적강당
- 주 체 : 해운대교육지원청

□ 투자심사 결과

- 조건부
- 2022~2026년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,005백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	5,005	0	0	0	0	5,005	0
국 비	4,503					4,503	
시 비	251					251	
구 비	251					251	
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 35%)

- 2022. 5월 : 설계공모 시행
- 2022. 8월 : 설계용역 착수
- 2023. 1월 : 설계용역 완료
- 2023. 12월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2024. 10월 : 공사 준공
- 2024. 12월 : 완료 정산

☐ 사업변경 내역

- 당초 2023. 12월 준공예정이었으나 토지 관련 등의 사정으로 진행이 늦춰져 2024. 10월경 준공 예정으로 변경됨

사업명	광안리4지구 연안정비사업	담당자	건설과 박상준(☎610-4712)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 2024년 5월
- 위 치 : 광안리 해수욕장
- 규 모 : 양빈 50,000m³

☐ 투자심사 결과 : 조건부 승인

- 2022~2026년 중기지방재정 계획 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	4,440	0	0	310	1,376	2,754	0
국 비	3,108			217	963	1,928	
시 비	400			46.5	105.5	248	
구 비	932			46.5	307.5	578	
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 33%)

- '20. 6. : 제3차 연안정비기본계획 반영
- '22. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수, 착수보고회
- '22. 7. : 용역 중간보고회 1차
- '22. 11. : 용역 중간보고회 2차
- '23. 1. : 용역 일시정지 (양빈사 공급비용 및 채취 재허가를 위한 해수부 협의)
- '23. 7. : 해역이용협의 착수
- '23. 10. : 해역이용협의 완료, 용역 일시정지 해제
- '23. 11. : 최종보고회, 기본 및 실시설계 용역 완료

☐ 향후계획

- '24. 3. : 공사 착공
- '24. 5. : 공사 준공

사업명	수영동 행정복지센터 재건립	담당자	행정지원과 남지윤(☎610-4112)
-----	----------------	-----	----------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 신축 후 40년이 경과하여 노후·협소한 동사의 재건립으로 지역주민의 숙원 사업 해결 및 변화하는 행정수요에 능동적 대응

☐
사업개요

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2027. 12월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 수영동 191-2
- 규 모 : 대지면적 486㎡, 연면적 997.5㎡, 지하1층/지상3층

☐
투자심사 결과 : 조건부 추진

- 주민편의 증진을 위해 부족한 주차면수 해결 방안 검토, 공공건축 업무절차에 따라 사업추진 등

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,545백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025이후
계	5,545	0	0	0	10	248	5,287
국 비	0						
시 비	0						
구 비	5,545	0	0	0	10	248	5,287
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐
추진상황(추진단계 및 공정율 5%)

- 2023년 : 공공건축기획 용역 추진
- 2024년 1월 : 공공건축심의

☐
향후계획

- 2024. 7월 : 설계 공모 추진
- 2024. 11월 ~ 2025. 6월 : 기본·실시설계용역 추진
- 2025. 9월 : 공사 발주 및 계약
- 2026. 1월 ~ 2027. 2월 : 공사 시행 및 준공

사업명	광안리 M 드론라이트쇼	담당자	스마트도시과 최영근(2610-4882)
-----	--------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국 최초 상설쇼, 전국 최대 드론쇼의 공연 연속성을 확보하고 수준 높은 공연 및 관람객 참여 이벤트로 부산의 대표 관광상품으로 성장
- 여름철에 집중되는 해수욕장 관광객의 한계를 넘어 비수기 없는 해변 운영을 통한 사계절 관광경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 계속
- 위 치 : 광안리해변
- 규 모 : 기념일·계절 등 다양한 주제로 500대 이상의 드론군집비행 공연

□ 투자심사 결과 : 조건부

- 시비와 구비 분담 비율 조정 후 추진
- 재원 다각화(국비 및 민자 확보 등) 방안 마련 필요
- 타·시도 유사행사(성남 드론라이트쇼 등) 분석 후 차별화 방안 마련 필요
- 개최후 계량화가 가능한 성과자료를 바탕으로 사후평가 및 보고 필요
(차기 심사 시 투자심사 신청서에 성과보고서 첨부)
- 중기지방재정계획 반영 필요

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	7,126	0	445	1,075	1,837	1,741	2,028
국 비	0						
시 비	1,497	0	0	0	0	500	997
구 비	5,629	0	445	1,075	1,837	1,241	1,031
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정률 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 공연개최실적 : 총 36일 64회
- 운영대수 : 500대(14일27회), 600대(17일32회), 1,000대(1일회), 1,500대(3일3회), 1700대(1일회)
- 프리포즈 공모전 개최 : 패밀리 프리포즈 이벤트 개최(2회 4팀)

☐ 향후계획

- 2024년 광안리 M 드론라이트쇼 행사대행 용역 계약 추진

사업명	광안리어방축제	담당자	문화관광과 백승진(☎610-4062)
-----	---------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국 유일 전통어촌마을 재현과 지역의 문화재를 테마로 소개하는 역사축제 경험 제공
- 전통과 현대가 어우러지는 수영의 우수한 역사문화 자원을 널리 전파

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 5. 10. ~ 5. 12.
- 위 치 : 광안리해변 및 수영사적공원 일원
- 규 모(안) : 뮤지컬 어방, 어방민속마을 등 45종목

구 분	프로그램(안)
대표프로그램(2)	① 뮤지컬 “어방” ② 경상좌수사행렬 퍼레이드
주 제 프로그램(6)	① 진두어화 ② 어방민속마을(전시·체험) ③ 수문장교대식 ④ 무형문화재공연(수영야류, 좌수영어방놀이, 수영농청놀이, 지신밟기) ⑤ 어방그물끌기 한마당 ⑥ 망궐레
문화·공연 프로그램(6)	① 개막공연 ② 폐막공연 ③ 수군무예공연 ④ 어방마당극(어방민속마을 수영사적공원) ⑤ 어방 낭만 버스킹 ⑥ 퍼레이드 공연
참여·체험 프로그램(16)	① 맨손으로 활어잡기 ② 어방수라간 ③ 생선회 깜짝경매 ④ 내왕소리체험 ⑤ 우리 옷 체험 ⑥ 수영성 민속대결 ⑦ 사진공모전 ⑧ 어방을 그리다 ⑨ 어방과거시험 ⑩ 전통민속놀이 체험 ⑪ 수영역사 문화탐방 ⑫ 어방골든벨 ⑬ 어린이그물낚시 체험 ⑭ 광안리 비치코밍 체험 ⑮ 황금보리수확 체험 ⑯ LED활쏘기 체험
부대행사 (15)	① 경상좌수사 행렬전시 ② SUP체험 ③ 문화예술의거리(수영야류·가품판매) ④ 드론라이트쇼 ⑤ 소망등 및 어등 전시 ⑥ 수영성별빛정원 ⑦ 황금보리 밭 전시 ⑧ 업소가격할인행사 ⑨ 싱싱활어장터 ⑩ 특산물장터 ⑪ 먹거리장터 ⑫ 수영행복페스티벌 ⑬ 어방환경체험관 ⑭ 어방골목장 ⑮ 어방EDM파티

□ 투자심사 결과

- 조건부 통과
- 재원 다각화(민자 및 국비 추가 확보 등), 중기지방재정계획 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,818백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	4,818	218	60	775	1,075	1,345	1,345
국 비	271	109	30	30	30	36	36
시 비	180	0	0	45	45	45	45
구 비	4,367	109	30	700	1,000	1,264	1,264
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 2024. 1월 일반행사 및 어방민속마을 조성 행사대행사 선정

☐ 향후계획

- 2024. 1월 : 예산집행 · 홍보계획 수립, 프로그램 선정 및 공연 기획
- 2024. 2월 : 기본계획 확정 · 부서시달, 홍보물 디자인 확정
- 2024. 3월 : 홍보물 제작 · 배포, 유관기관(단체) 업무협의, 추진상황 보고회
- 2024. 4월 : 홍보물 설치, 시설물 배치, 최종 보고회, 행사실행, 집중 홍보
- 2024. 5~6월 : 축제평가·정리, 기획사 등 축제관계자 프로그램별 자체평가 회의

사업명	청년과 함께하는 커뮤니티 복합 공간[광:안뜰] 조성사업	담당자	일자리경제과 김수나(☎610-4822)
-----	--------------------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 행정안전부 「지역사회 활성화기반 조성사업」 이 일환으로 지역 내 유휴공간을 활용하여 청년 주도 공간 조성
- 청년 네트워크 활성화 및 역량강화 공간 제공으로 청년의 성장 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 부산광역시 수영구 수영로 603번길 18
- 규 모 : 연면적 687.26㎡, 지상3층
- 공간구성 : (1층)컨벤션홀, 창고 (2층)야외테라스 (3층)공유사무실 등

□ 투자심사 결과

- 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획에 반영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,950백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	4,950	1,728	0	22	179.3	3,020.7	0
국 비	1,011	0	0	11	176.5	823.5	0
시 비	505.5	0	0	5.5	1.4	498.6	0
구 비	3,433.5	1,728	0	5.5	1.4	1,698.6	0
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 10%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2023. 6월
- 경관심의 완료 : 2023. 11월
- 광안상가 철거 완료 : 2023. 12월
- 기본 및 실시설계용역 시행중 : 2024. 2월말 완료 예정
- 설계안전성 검토용역 발주 : 2024. 1월

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2024. 2월
- 공사 착공 및 추진 : 2024. 4월
- 준공 및 개소 : 2024. 12월

사업명	광안리 발코니음악회 운영	담당자	문화관광과 공예지(☎610-4065)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 광안리 M드론 라이트쇼와 연계하여 수영구만의 특색 있는 행사로, 새로운 문화공연을 통해 찾고 싶은 광안리 조성
- 지역예술가 및 청년예술가들의 참여를 통해 문화예술계를 지원하고 광안리를 찾는 주민들과 관광객들에게 다양한 문화향유의 기회를 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1 ~ 12.
- 위 치 : 수영구생활문화센터(광안해변로 219)
- 규 모 : 매월 마지막주 토요일, 광안리M드론 라이트쇼 1부 종료 후 수영구 생활문화센터 발코니에서 클래식, K-pop, 댄스 등 다양한 장르의 음악회 개최(총12회)

□ 투자심사 결과

- 조건부 추진
- 2023~2027년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 360백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	360	0	0	0	120	120	120
국 비	0						
시 비	0						
구 비	360	0	0	0	120	120	120
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 세부추진계획 수립 예정

□ 향후계획

- 2024. 1 ~ 12월 : 발코니음악회 개최(월1회, 총12회 개최)
 - (1~ 2월) 협상에 의한 계약 추진 및 음악회 2회 개최
 - (3~12월) 선정 업체에서 음악회 운영

사업명	카운트다운 부산	담당자	문화관광과 백승진(☎610-4062)
-----	----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 새해를 맞이하여 시민들에게 한 해의 위로와 추억을 제공
- 광안대교를 연계한 부산 대표 새해맞이 행사로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024.12.31.~ 2025.1.1.
- 위 치 : 광안리해변 일원
- 규 모
 - ▷ 식전행사 : 시민참여 프로그램(포토월, 레크리에이션 등)
 - ▷ 본 행 사 : 새해맞이 신년 음악회
 - ▷ 카운트다운 퍼포먼스 : 광안대교 미디어파사드 및 드론라이트 쇼 등
 - ▷ 참여인원 : 약 1만 여명

□ 투자심사 결과

- 조건부 통과
- 2021~2025 중기지방재정계획에 반영하는 조건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	580	100	80	100	100	100	100
국 비	0						
시 비	0						
구 비	580	100	80	100	100	100	100
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진상황(추진단계 및 공정률 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 세부추진계획 수립 예정

□ 향후계획

- 2024. 10월 중 기본계획 수립(드론라이트쇼 연계)
- 안전관리계획 수립 및 유관기관 협의

사업명	APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN	담당자	문화관광과 송수호(☎610-4952)
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대한민국 최초로 SUP 국제대회를 개최함으로써 SUP 특화지역인 광안리 SUP Zone의 위상을 제고하고, 대한민국 최초 SUP 국제대회 개최지라는 명성 확보를 통해 광안리해변 SUP 인구 저변 확대 ○ 지속적인 세계대회 유치로 외부 관광객이 유입될 수 있는 스포츠 관광 문화 환경을 조성하여 지역경제(관광, 숙박, 요식업 등) 활성화 유도 <div>□ 사업개요</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월(3년) ※ 향후 연장 가능 ○ 위 치 : 광안리해변 일원 ○ 규 모 <ul style="list-style-type: none"> - 참가규모 : 54개국 1,000여명(세계 SUP 프로 및 국가대표 상위랭크 60명 등 포함) - 대회구성 : 16개 프로그램 구성(대회 6, 이벤트 10) <div>□ 투자심사 결과</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부 승인 ○ 승인 조건 <ul style="list-style-type: none"> - 재원 다각화(국비 및 민자추가 확보 등) 방안 마련 필요 - 수영구 자체재원(구비)으로 사업 추진 - 2030 부산 세계 엑스포 홍보방안 연계 계획 수립 후 추진 - 행사 안전대책 수립 및 관계기관(소방, 경찰 등) 사전협의 필요(주민불편 최소화 방안 포함) - 개최 후 계량화가 가능한 성과자료를 바탕으로 사후평가 및 보고 필요 - 중기지방재정계획 반영 필요 			

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,470백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2021	2022	2023	2024	2025 이후
계	2,470	0	0	1,000	700	770	0
국 비	320	0	0	200	0	120	0
시 비	0						
구 비	700	0	0	200	250	250	0
지 방 채	0						
민간자본	1,450	0	0	600	450	400	0
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정률 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 2023 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 개최 및 정산
- 2024 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 선정 : 국비 120백만원

☐ 향후계획

- (24년 국비 교부 즉시) 국비 120 백만원 추경 예산 반영
- (24년 8월) 2024 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 세부계획 수립
- (24년 8월) 2024 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 보조금 교부
- (24년 10월) 2024 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 대회 개최

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 수영구에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

9-3 민간투자사업

☐ 우리 수영구에서 '23년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.
